



Estado de Rondônia
Prefeitura Municipal de Vilhena
Gabinete do Prefeito



OFÍCIO Nº 547/2021/GAB

Vilhena/RO, 23 de agosto de 2021.

Ao Senhor
SALES LUIZ JÚNIOR
Diretor Legislativo
Câmara Municipal de Vilhena
Av. Tancredo Neves, 4308
76.987-650 Vilhena.RO

Assunto: Ofício nº 058/2021/DL-CVMV.

Senhor Diretor,

Em atenção ao Ofício supramencionado, encaminho anexo o Memorando nº 197/2021/SEMUS, contendo informações acerca do solicitado.

Atenciosamente,


EDUARDO TOSHIYA TSURU
Prefeito Municipal

CÂMARA MUNICIPAL DE VILHENA
DIRETORIA LEGISLATIVA

Data 24 / 08 / 2021
Hora 07:41





Prefeitura de
VILHENA



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE

MEMO.Nº197/2021

Vilhena, 20 de agosto 2021

DE: SEMUS

URGENTE

PARA: GABINETE DO PREFEITO

ASSUNTO: DEVOLUÇÃO DE PROJETO DE LEI

Em resposta ao Ofício de nº058/2021/DL-CVMV é o que segue:

Item 02. Projeto de Lei nº6.171/2021

A, B e C) Quanto aos itens mencionados, dentro do presente processo de nº252/2020 não conta tais documentos solicitados de aceite da SEMOSP, solicitação da SEMUS e resposta negativa da SEMOSP para a retirada da cobertura. Portanto vale destacar que consta a nota técnica fls. 1461 e 1462 assinada pelo Engenheiro da SEMPLAN explicando que o fiscal da obra juntamente com o secretário da época entendeu que seria mais vantajoso à administração, a remoção com mão de obra da empresa contratada em conformidade com o (anexo).

D) Cópia das medições de fiscalização da Obra em (anexo)

E) Cópias dos boletins Diários de Obras em anexo.

F) Dá a entender nos autos que a Data da elaboração da Nota Técnica seja 25/05/2021 pois é a data da planilha orçamentária fls.1457 a 1459, apensada na ordem cronológica.



Prefeitura de
VILHENA



SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE



G) Motivo das páginas (sem efeito), devido a servidora ter se equivocado com a sequência da numeração, no caso em tela o município segue a instrução normativa de número 005/CGM/2013 quando se erra a numeração das páginas.

- Arquivos dos itens D, E e F (entregues via pendrive)

Atenciosamente,

Siclinda Raascha
Secretária Municipal de Saúde

Handwritten signature
Dionny Kelly R. Ventura de Oliveira
Secretário Adjunto
Decreto 45.529/2019

Handwritten signature
Thiago Finney Siqueira Santos
Coordenador do Fundo Municipal de Saúde



MUNICÍPIO DE VILHENA

SEMPLANProc.:
25.2/2020

Fl.: 1153

Despacho nº 34

DE: SEMPLAN
PARA: SEMUS

Com nossos cordiais cumprimentos, estamos encaminhando o presente processo para as devidas providências, a saber:

Vem os autos para análise da planilha e demais documentos da área técnica de engenharia referentes à seguinte medição:

A) 1ª Medição do Contrato: 028/2020

Para efeito de pagamento, proporcional, conforme contratado, utilizar as seguintes Notas de Empenho:

NOTA DE EMPENHO		VALOR	
CONV	2588/2020	-	57.023,74
RP	-	-	-
		TOTAL	57.023,74

Esta medição foi aferida e aprovada pela Caixa Econômica conforme documento:
CE nº 1082/2020/GIGOV/PV (fls. 1122 e 1123)

Foram acostados todos os documentos que tratam da matéria:

Documento	Folha(s)
Relatório de Fiscalização	1124
Planilha de Medição	1125 a 1140
Fotos	1141 a 1148

Após análise, verificou-se que

297 dias de vigência do contrato;

113 dias para execução da obra.

Ressalto aqui que este setor de engenharia analisa as peças técnicas, não verificando a legalidade dos atos em si.

Seguem os autos para as demais providências e análises de praxe.

Vilhena/RO, 20/10/2020

Eng.º Civil Matia Sobral Viana
CREA/RJ 147601/D
Visto RO 4.200/2.001



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN

Proc. 259/2020
Fl.: 1205

A- Identificação

1) Nome do Projeto

Reforma Hospital Regional de Vilhena

2) Localização

Setor 05 - Quadra 33 - Lote 02

3) Dados da Obra

ART/RRT de Autoria:	Andrea Couto Ferraz	n°	8923353
ART/RRT de Execução:	Adones Hoffmann	n°	8300332215
ART/RRT de Fiscalização:	Renan Vieira de Andrade	n°	8300332479
Empresa Contratada:	CONSTRUVIL Construtora e Instaladora Vilhena LTDA		
Contrato	028/2020-SEMUS	Processo Administrativo	252/2020
Período de Medição:	26/09/2020	à	28/10/2020
Valor Contratado	R\$ 1.689.192,28	Medição:	2ª
Valor pago na medição:	R\$ 216.155,57	Percentual da medição:	12,80%
Valor Acumulado:	R\$ 273.179,31	Percentual Acumulado:	16,17%
Saldo de Medição	R\$ 1.416.012,97	Percentual de Saldo	83,83%

4) Certificação da Fiscalização

Após verificação *in loco* dos serviços executados, certifico, conforme determinação da Portaria de Fiscalização, que a empresa contratada para a obra do processo em epígrafe, no período de medição informado:



Está Executando



Executou

Os itens executados encontram-se lançados na planilha de medição apresentada.

Dê-se prosseguimento ao processo, mediante a apresentação pela empresa contratada, de todos os documentos com probatórios quanto a sua situação fiscal com todos os órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive a Nota Fiscal dos serviços prestados no valor indicado acima.

Vilhena, 12 de novembro de 2020

Observações:

- 1- O Diário de Obras do período acima informado, foi protocolado na SEMPLAN;
- 2- Pagamento conforme Ofício n° 1145/2020/GIGOV/PV, de 30/10/2020.

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO




MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN


RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 2a. Medição

Proc.: 252/2020

Fl.: 1222

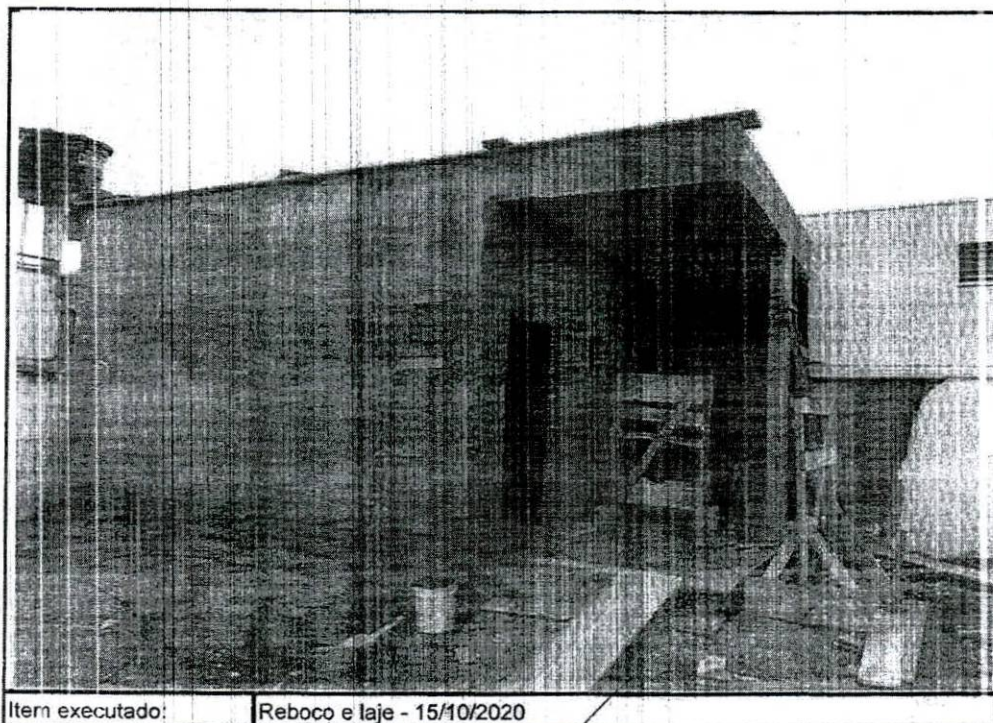

Item executado: Reboco e laje - 15/10/2020

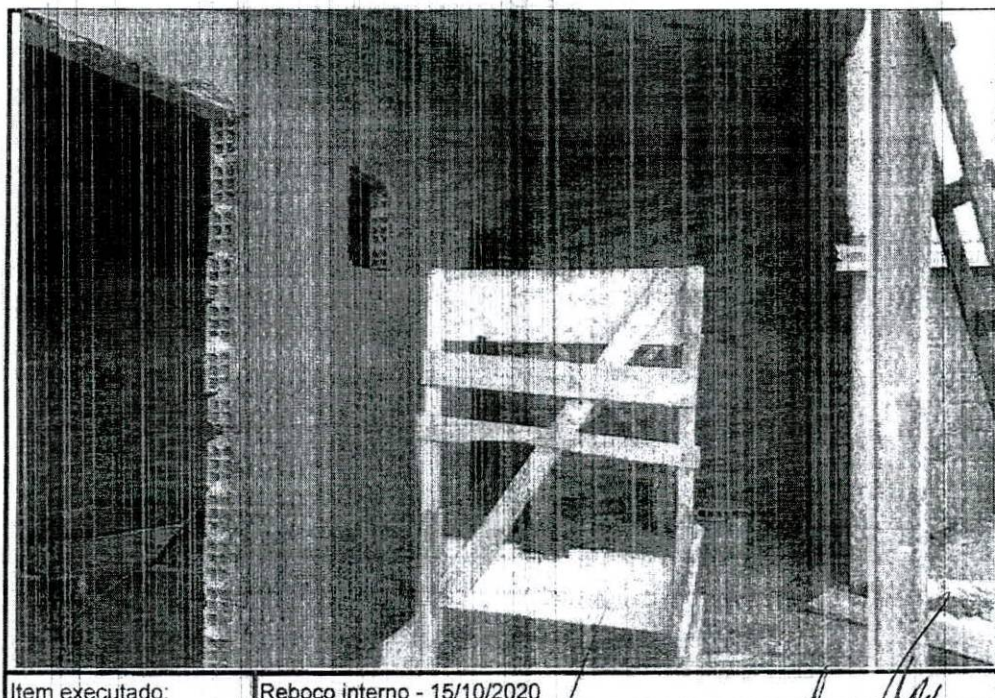


Item executado: Reboco interno - 15/10/2020


Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Câmara Municipal de Vilhena
Proc n 167/21
Fls 85-V
mas

Proc.: 21/2020
Fl.: 1793
P

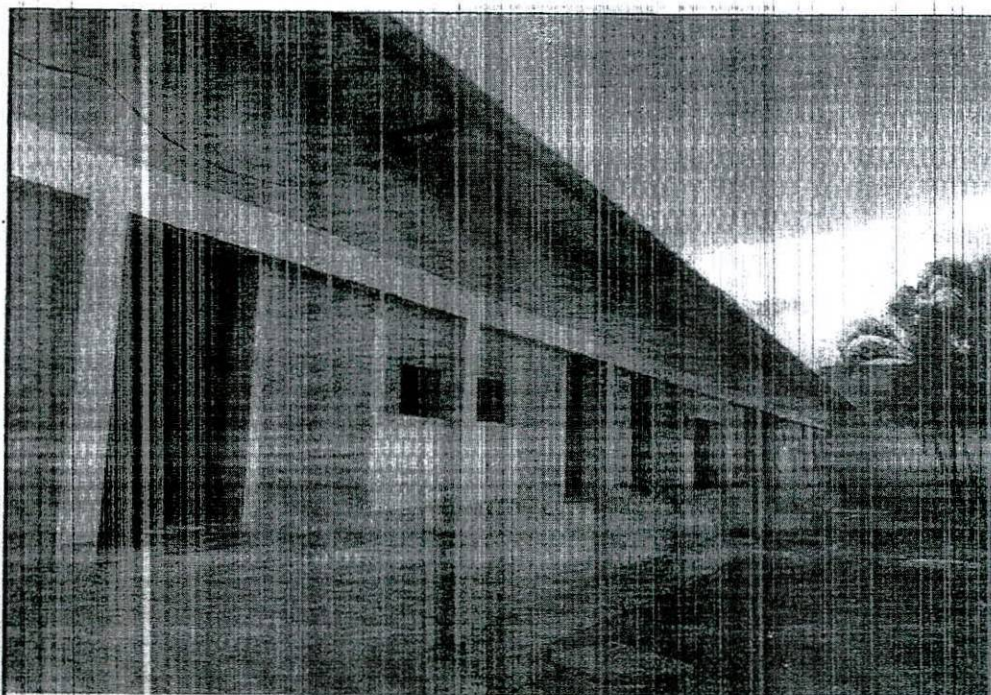

Item executado: Reboco externo ortopedia - 22/10/2020 ✓

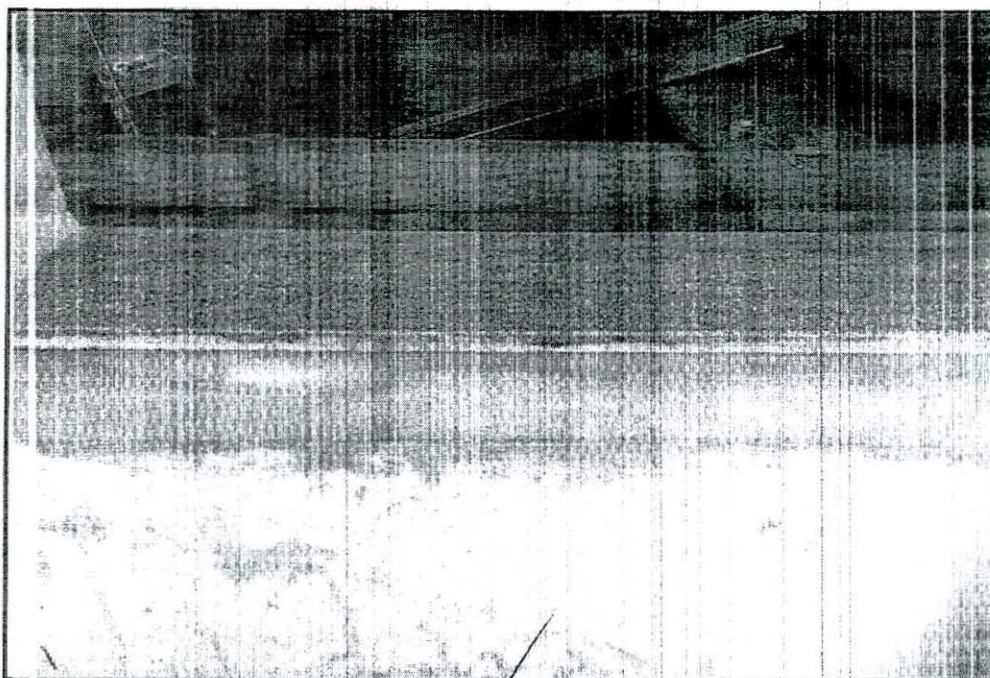


Item executado: Peitoril - 22/10/2020 ✓

Renan Vieira de Andrade
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Proc.: 252/2020
Fl.: 1204



Item executado: Estrutura metálica - 22/10/2020

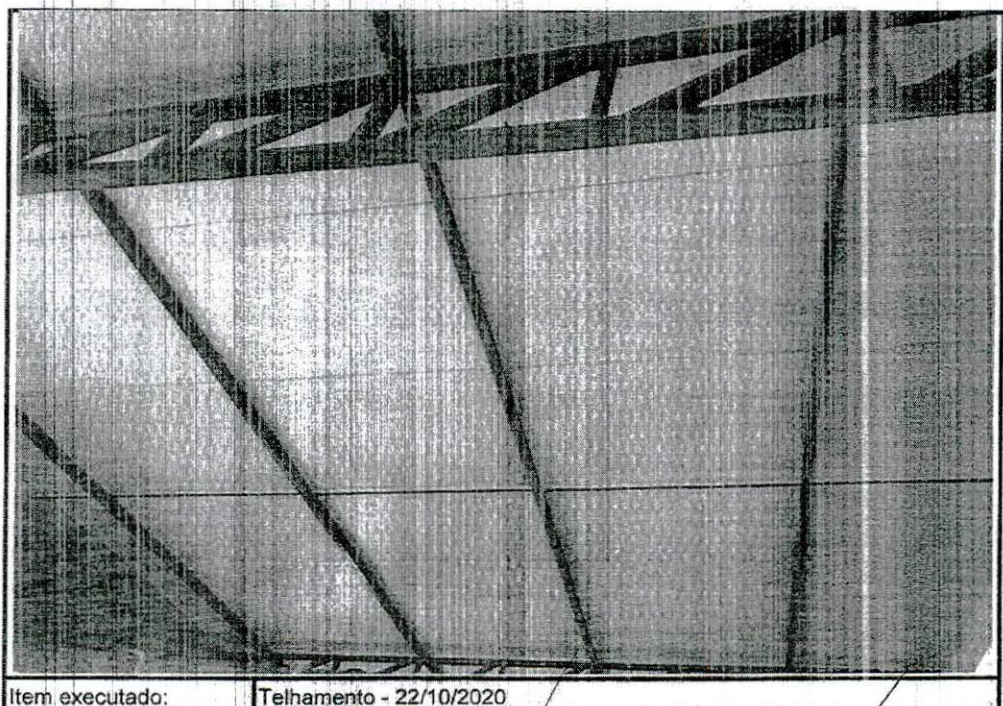


Item executado: Telhamento - 22/10/2020

Renan Vieira de Andrade
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/L
Visto 9627 RO


Câmara Municipal de Vilhena
Proc n 167/21
Fls 36-V

MA

Proc.: 257/20
Fl.: 1225
D

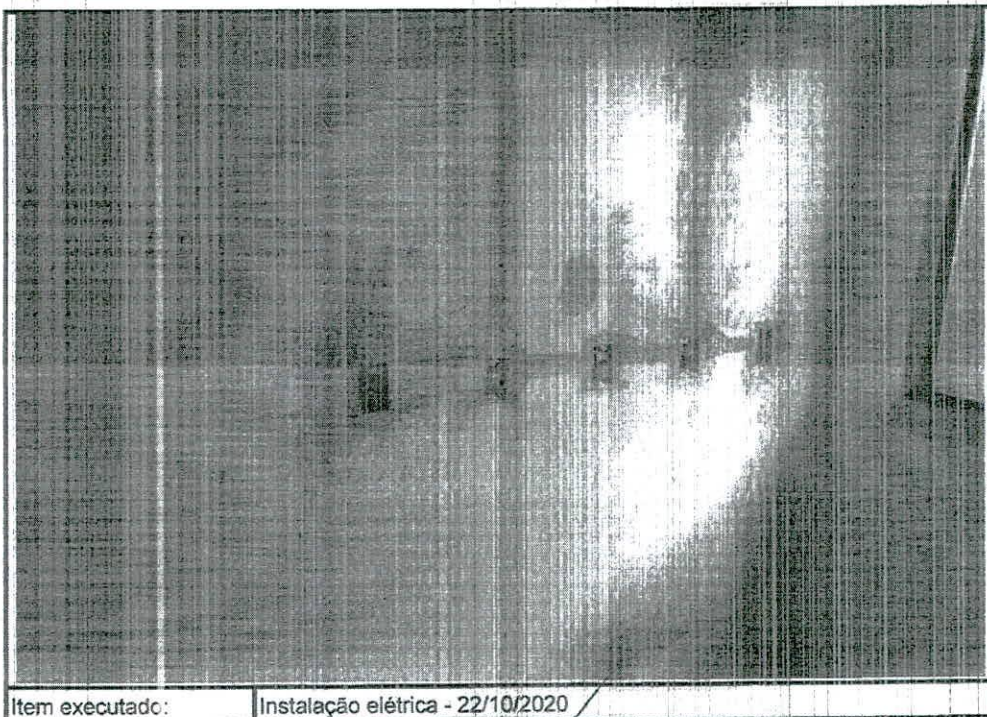


Item executado: Instalação elétrica - 22/10/2020

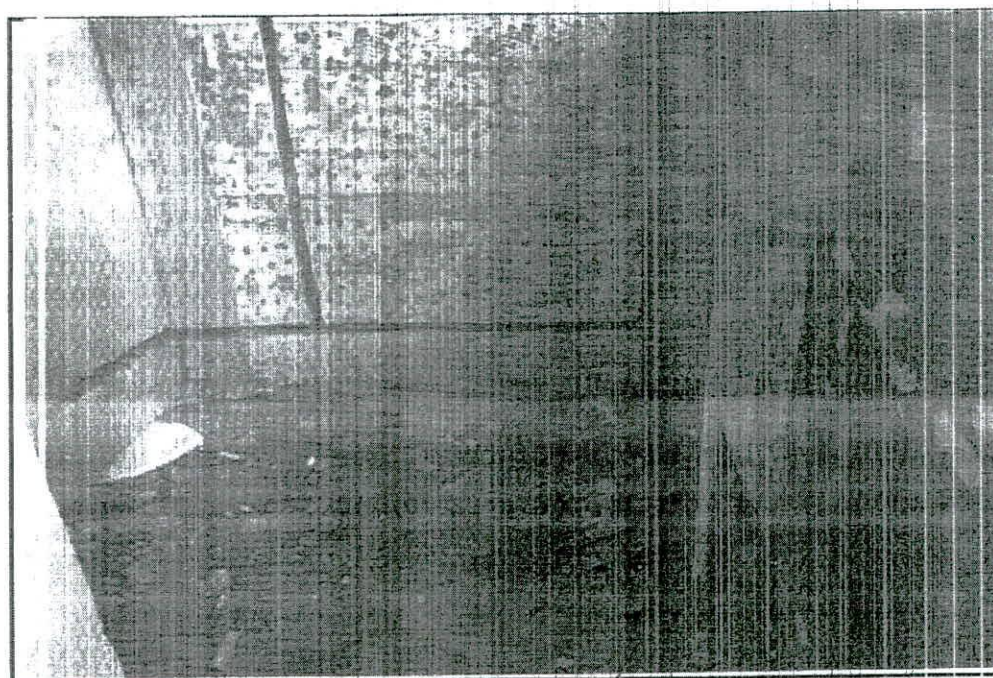


Item executado: Instalação hidráulica - 22/10/2020

Renan Vieira de Andrade
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Proc.: 257/2020
Fl.: 1776

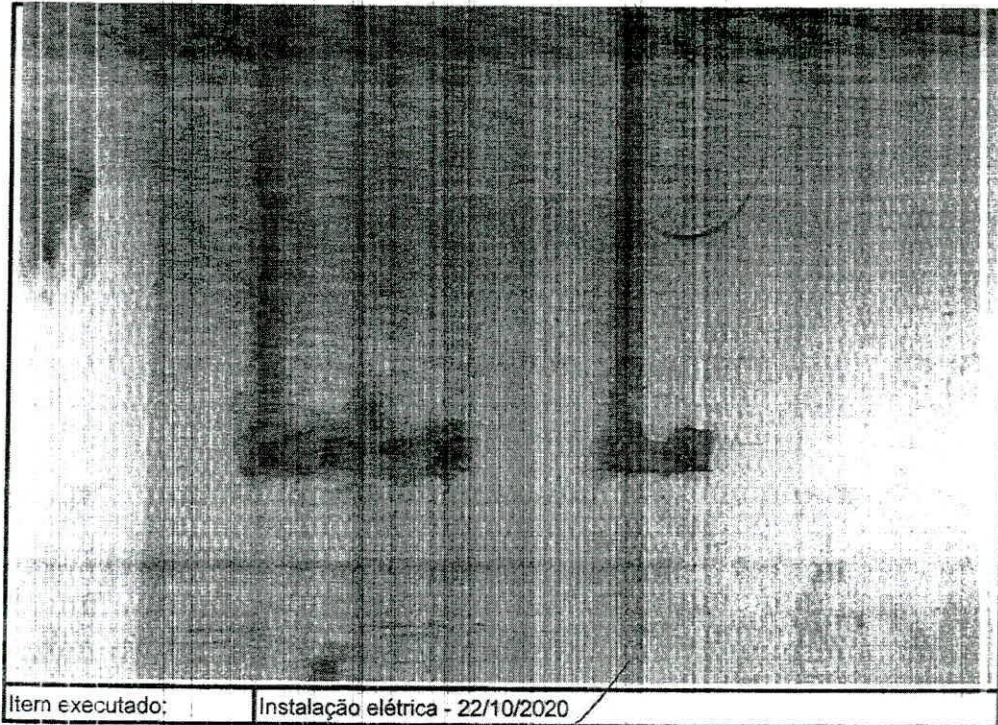

Item executado: Instalação elétrica - 22/10/2020

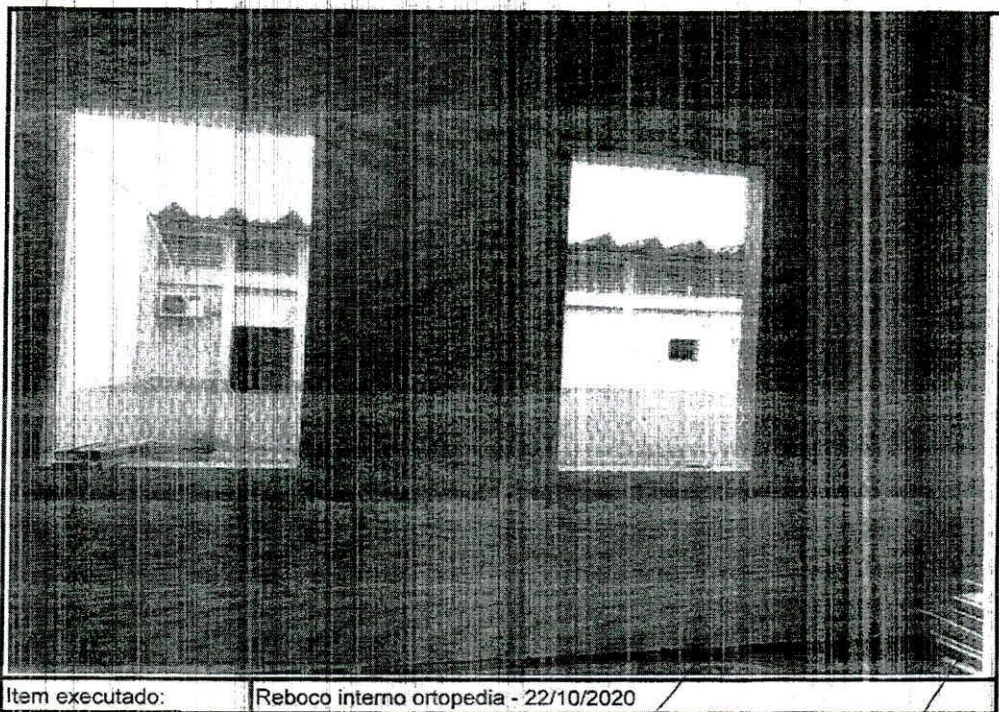

Item executado: Reboco interno ortopedia - 22/10/2020

Renan
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN

Proc. 25/2020
Fl: 1300

A- Identificação

1) Nome do Projeto

Reforma Hospital Regional de Vilhena

2) Localização

Setor 05 - Quadra 33 - Lote 02

3) Dados da Obra

ART/RRT de Autoria:	Andrea Couto Ferraz	n°	8923353
ART/RRT de Execução:	Adones Hoffmann	n°	8300332215
ART/RRT de Fiscalização:	Renan Vieira de Andrade	n°	8300332479
Empresa Contratada:	CONSTRUVIL Construtora e Instaladora Vilhena LTDA		
Contrato	028/2020-SEMUS	Processo Administrativo	252/2020
Período de Medição:	29/10/2020	30/11/2020	Medição: 3ª
Valor Contratado	R\$ 1.689.192,28		
Valor pago na medição:	R\$ 278.817,48	Percentual da medição:	16,51%
Valor Acumulado:	R\$ 551.996,79	Percentual Acumulado:	32,68%
Saldo de Medição	R\$ 1.137.195,49	Percentual de Saldo	67,32%

4) Certificado da Fiscalização

Após verificação *in loco* dos serviços executados, certifico, conforme determinação da Portaria de Fiscalização, que a empresa contratada para a obra do processo em epígrafe, no período de medição informado:

☒ Está Executando

☐ Executou

Os itens executados encontram-se lançados na planilha de medição apresentada.

Dê-se prosseguimento ao processo, mediante a apresentação pela empresa contratada, de todos os documentos comprobatórios quanto a sua situação fiscal com todos os órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive a Nota Fiscal dos serviços prestados no valor indicado acima.

Vilhena, 22 de dezembro de 2020

Observações:

- 1- O Diário de Obras do período acima informado, foi protocolado na SEMPLAN.
- 2- Pagamento conforme Ofício n° 1332/2020/GIGOV/PV, de 21/12/2020.

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO


149




MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 3a. Medição

Proc.: 254/2020
Fl.: 1314

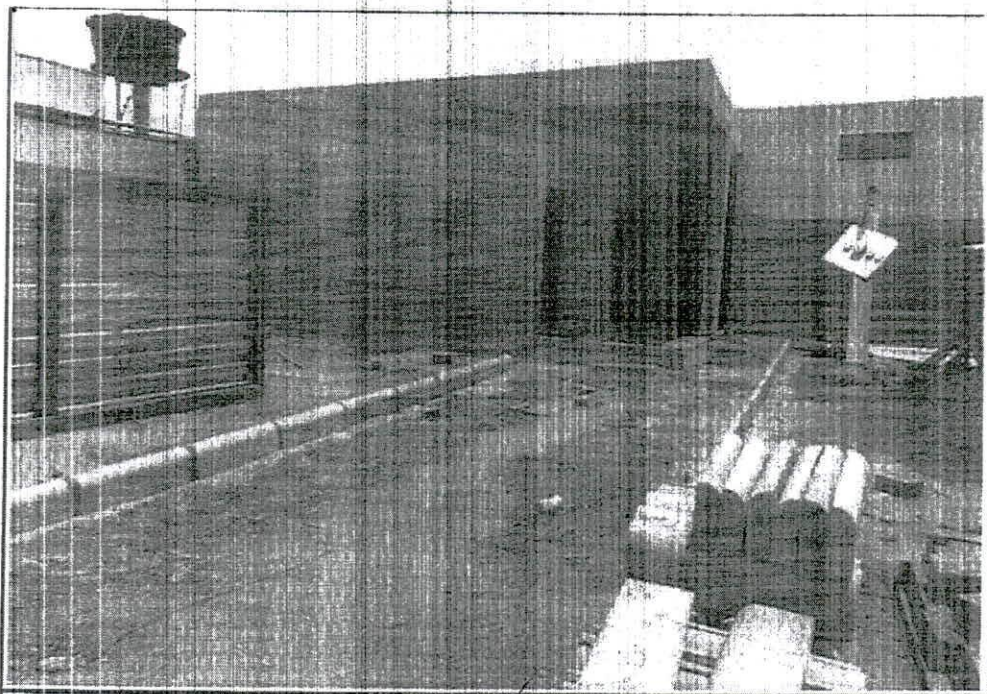

Item executado: Meio fio - 06/11/2020


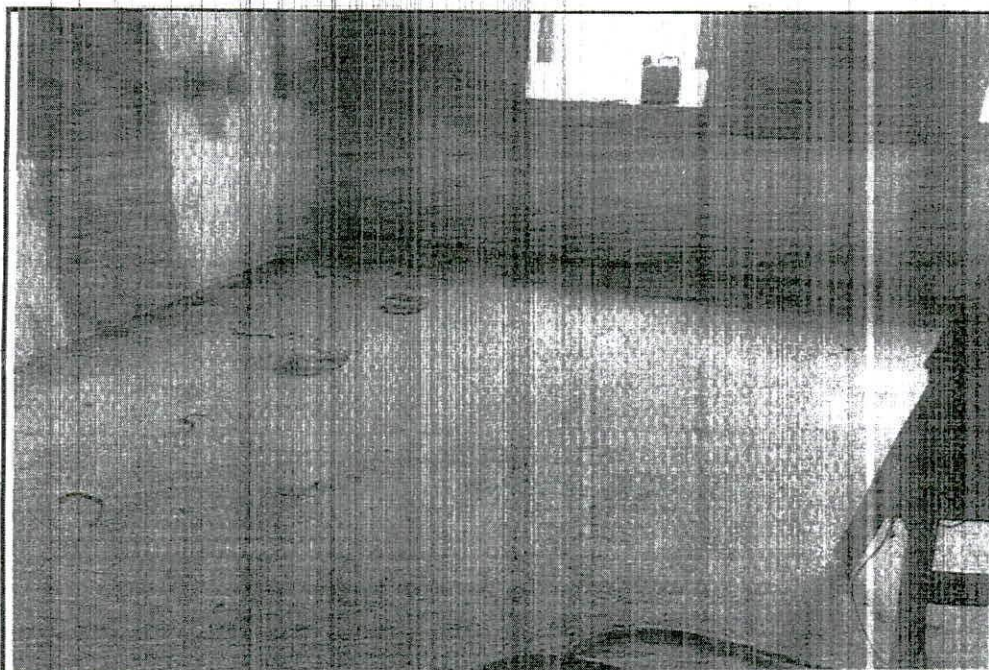


Item executado: Piso granilite - 06/11/2020

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Câmara Municipal de Vilhena
Proc n 167/21
Fls 38-V
HT


Proc.: 25/2020
Fl.: 1315
P

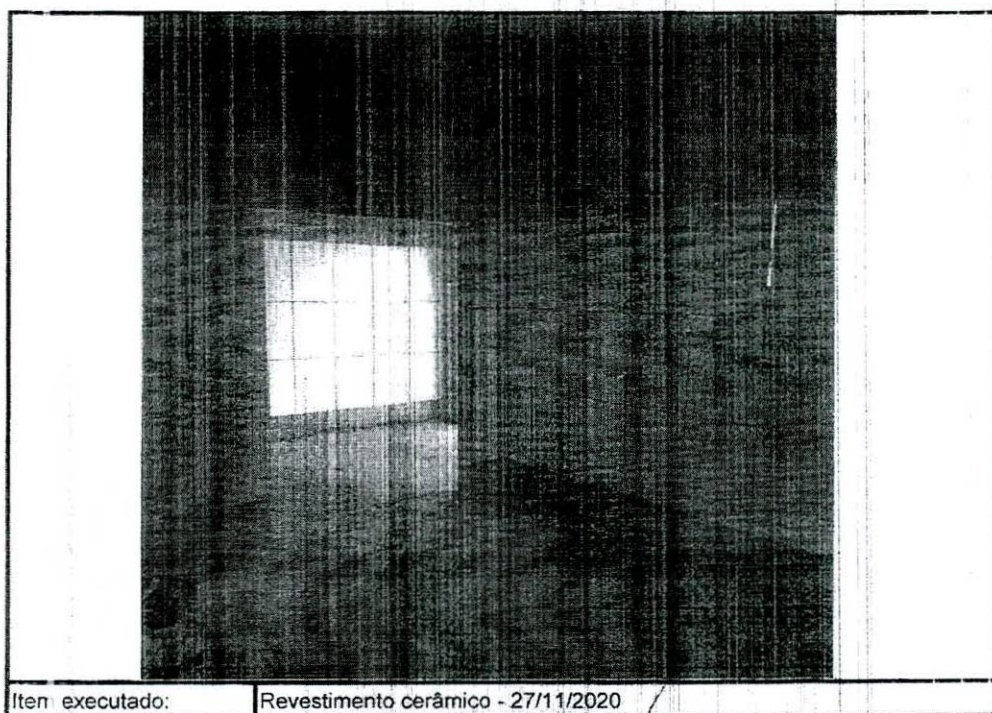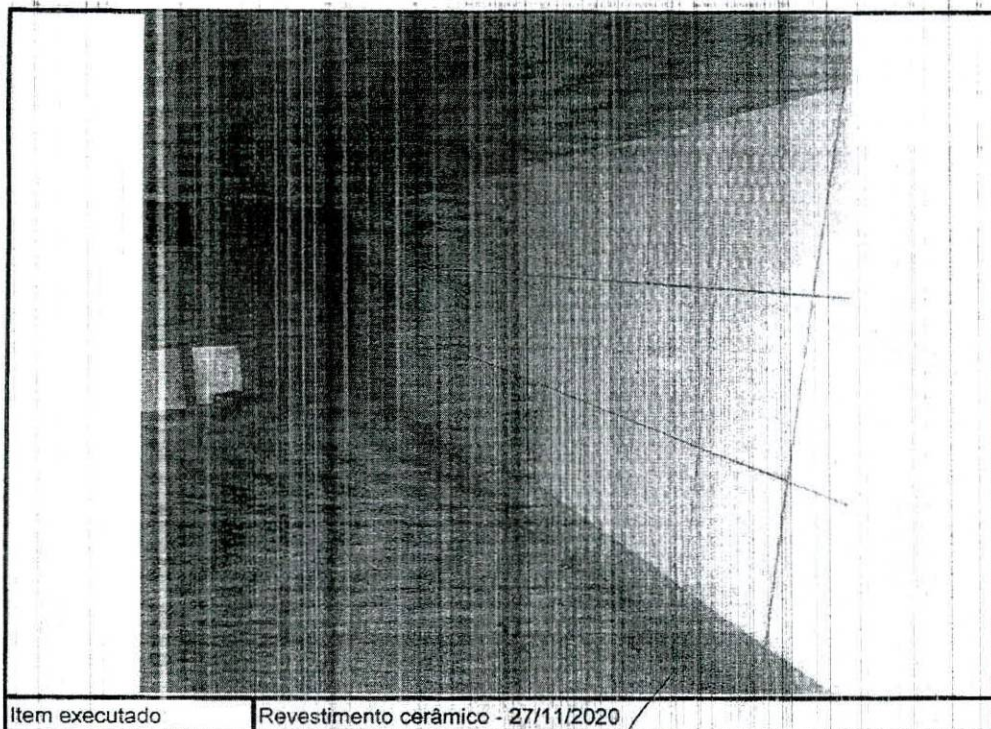


Renan Vieira de Andrade
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Proc.: 254/2020

Fl.: 1218

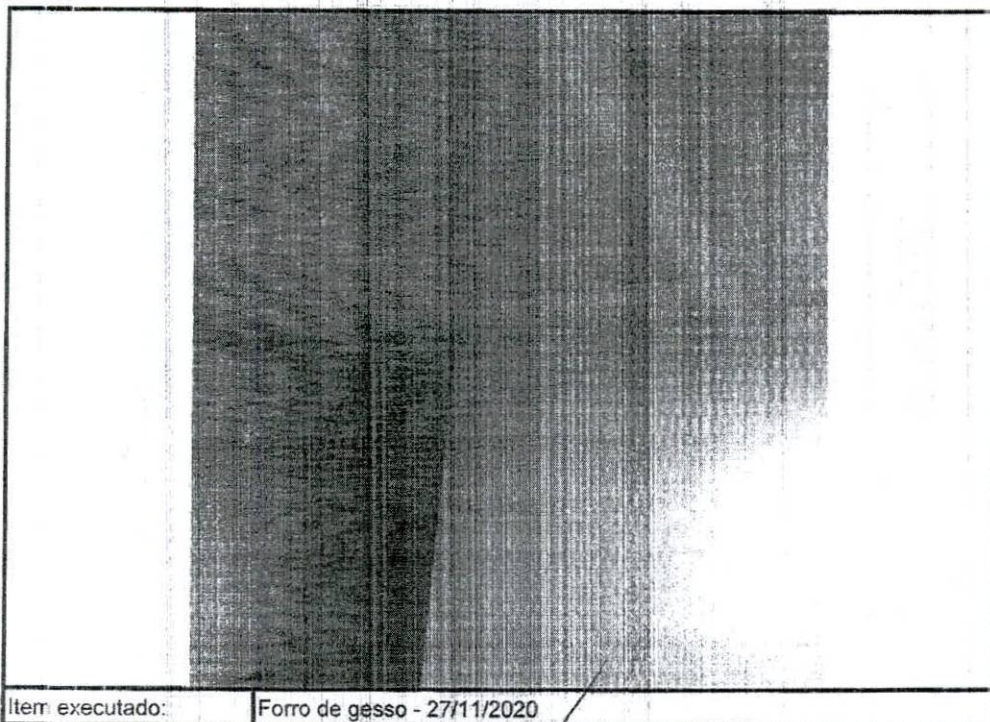

Item executado: Forro de gesso - 27/11/2020

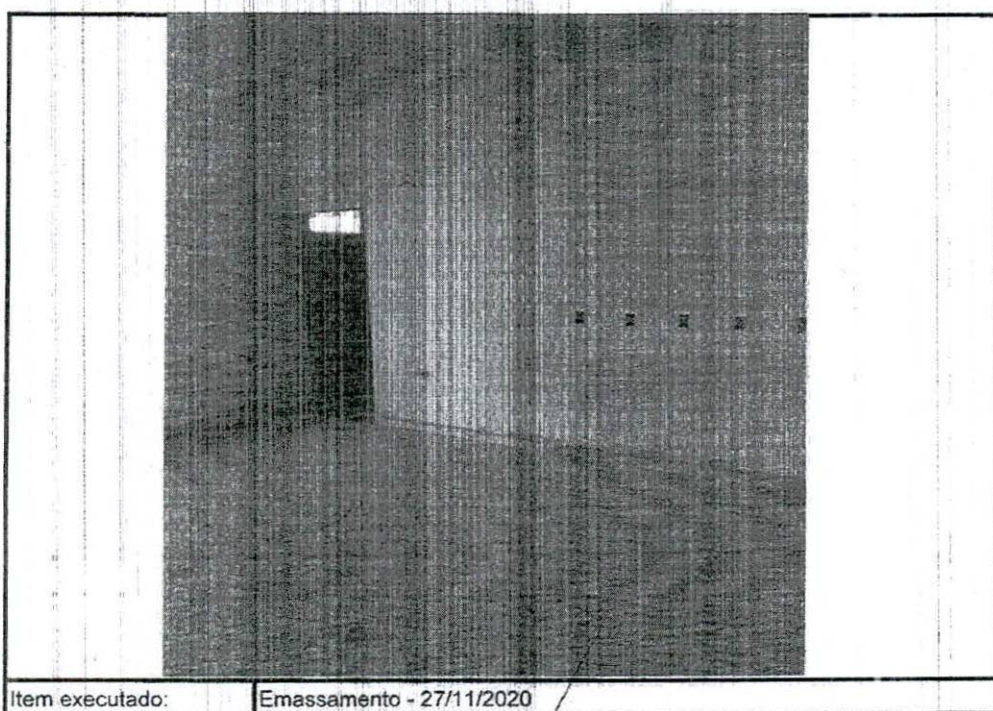


Item executado: Emassamento - 27/11/2020


Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Câmara Municipal de Vilhena
Proc n 167/21
Fls 80-V
HMS

Proc.: 22/2020
Fl.: 1318

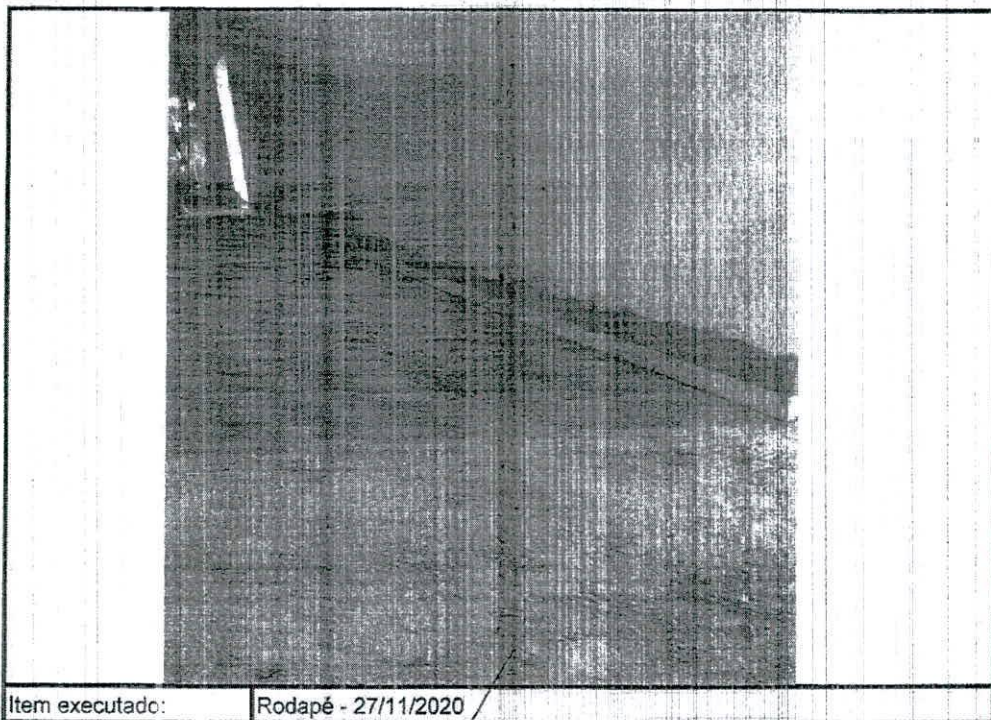

Item executado: Rodapé - 27/11/2020

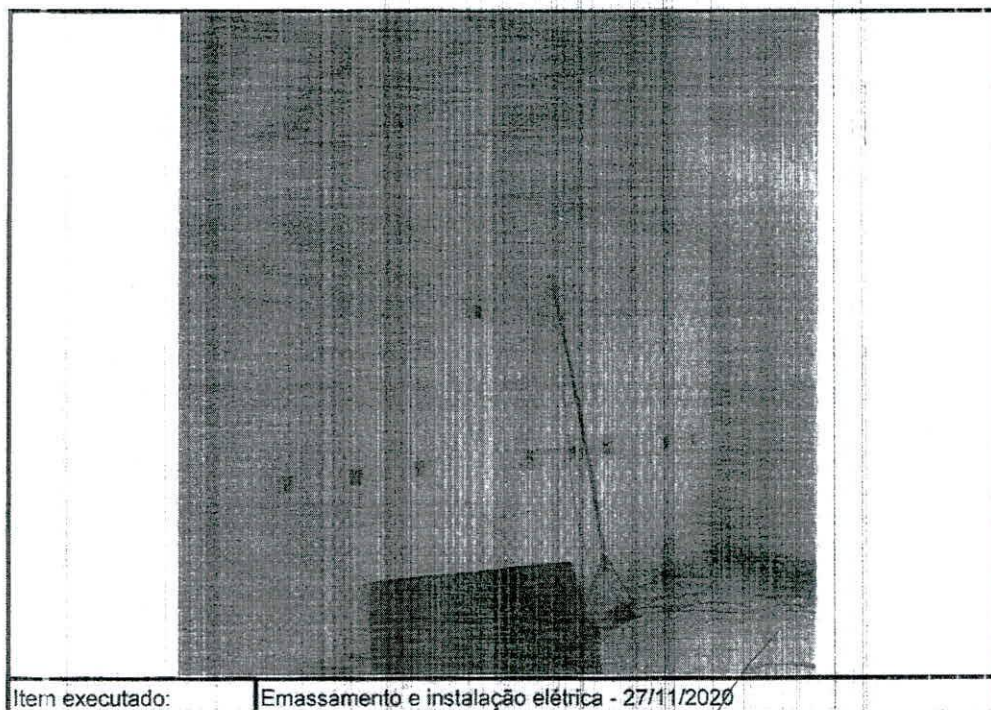


Item executado: Emassamento e instalação elétrica - 27/11/2020


Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

[Handwritten signature]

Proc.: 252/2020
Fl.: 1316

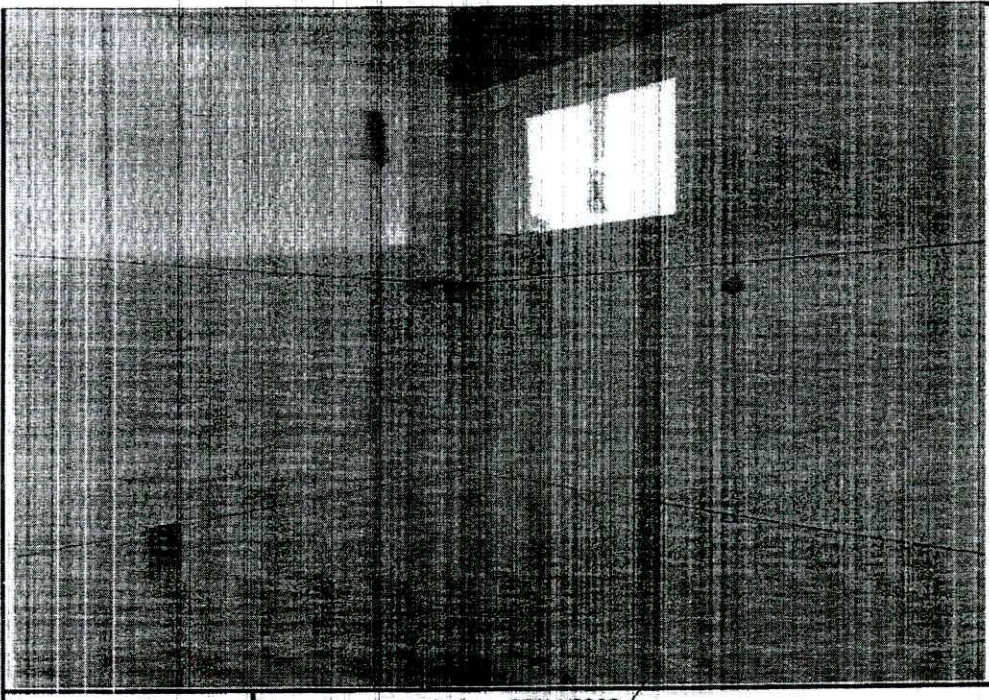

Item executado: Revestimento cerâmico - 27/11/2020 /

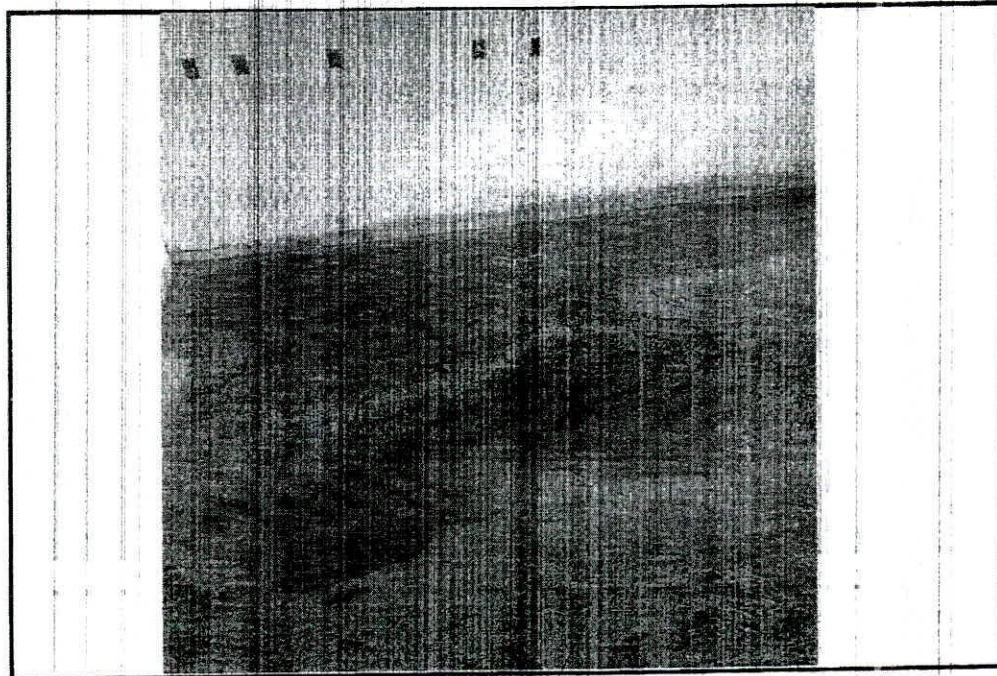

Item executado: Piso granilite - 27/11/2020 /

[Handwritten signature]
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPPLAN

Proc.: 252/20
Fl.: 1322
7

A- Identificação

1) Nome do Projeto

Reforma Hospital Regional de Vilhena

2) Localização

Setor 05 - Quadra 33 - Lote 02

3) Dados da Obra

ART/RRT de Autoria:	Andrea Couto Ferraz	n°	8923353
ART/RRT de Execução:	Adones Hoffmann	n°	8300332215
ART/RRT de Fiscalização:	Renan Vieira de Andrade	n°	8300332479
Empresa Contratada:	CONSTRUVIL Construtora e Instaladora Vilhena LTDA		
Contrato	028/2020-SEMUS	Processo Administrativo	252/2020
Período de Medição:	01/12/2020	à	27/01/2021
Valor Contratado	R\$ 1.689.192,28	Medição:	4ª
Valor pago na medição:	R\$ 163.657,96	Percentual da medição:	9,69%
Valor Acumulado:	R\$ 715.654,75	Percentual Acumulado:	42,37%
Saldo de Medição	R\$ 973.537,53	Percentual de Saldo	57,63%

4) Certificado da Fiscalização

Após verificação *in loco* dos serviços executados, certifico, conforme determinação da Portaria de Fiscalização, que a empresa contratada para a obra do processo em epígrafe, no período de medição informado:

☒ Está Executando

☐ Executou

Os itens executados encontram-se lançados na planilha de medição apresentada.

Dê-se prosseguimento ao processo, mediante a apresentação pela empresa contratada, de todos os documentos com probatórios quanto a sua situação fiscal com todos os órgãos federais, estaduais e municipais, inclusive a Nota Fiscal dos serviços prestados no valor indicado acima.

Vilhena, 01 de fevereiro de 2021

Observações:


- 1- O Diário de Obras do período acima informado, foi protocolado na SEMPLAN;
- 2- Pagamento conforme Ofício n° 75/2021/GIGOV/PV, de 29/01/2021.

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO




MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
SEMPLAN
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - 4a. Medição

Câmara Municipal de Vilhena
Proc. n.º 14.724
Fis. 14.724
Proc.: 258/20
Fl.: 1823
5

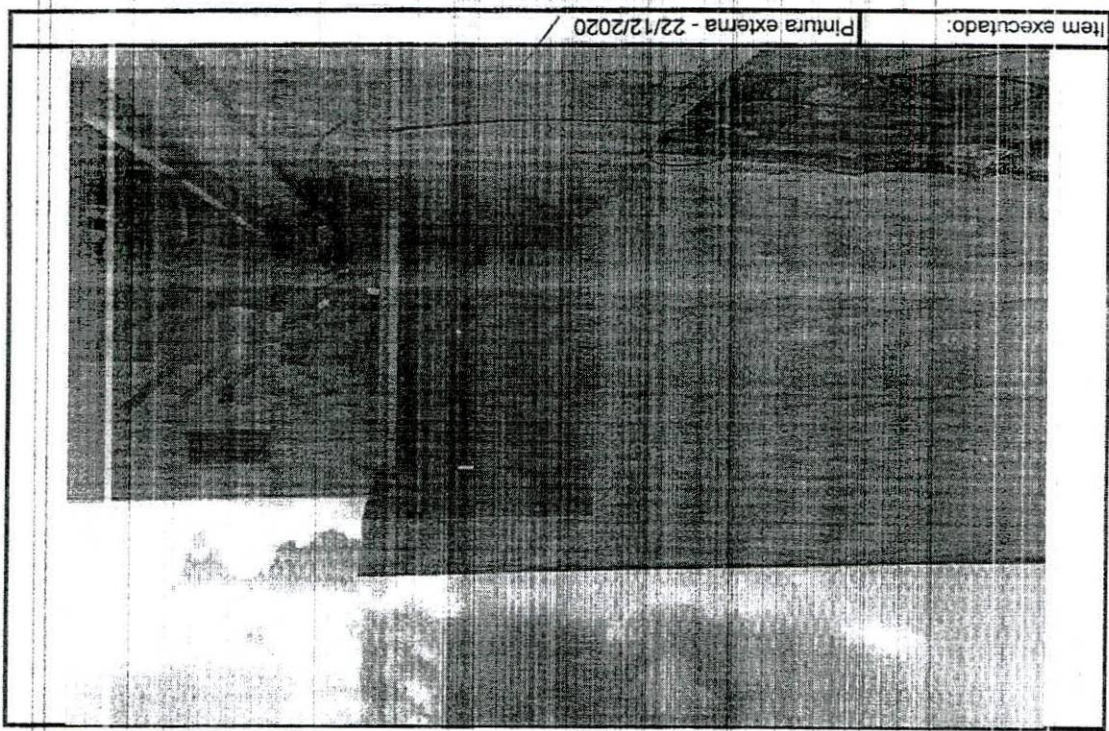

Item executado:

Pintura externa - 22/12/2020 /

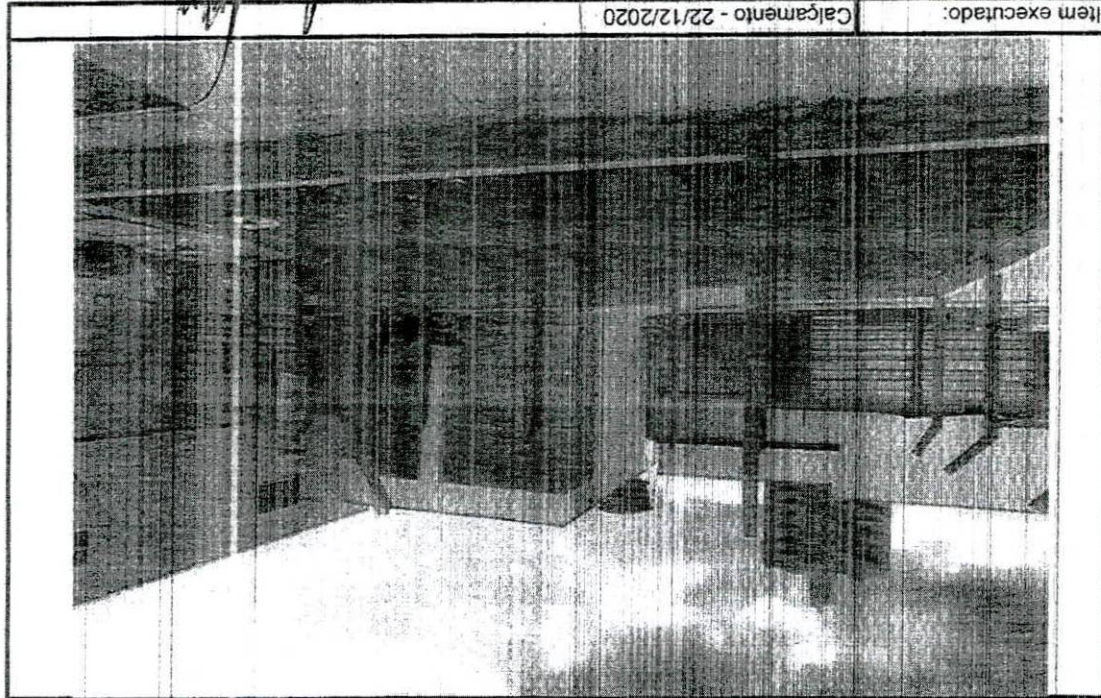

Item executado:

Calçamento - 22/12/2020

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Câmara Municipal de Vilhena
Proc n 262/20
Fls 43-V

Proc. 262/20


Fl. 43-V

5



Item executado:


Piso granilite - 20/01/2021

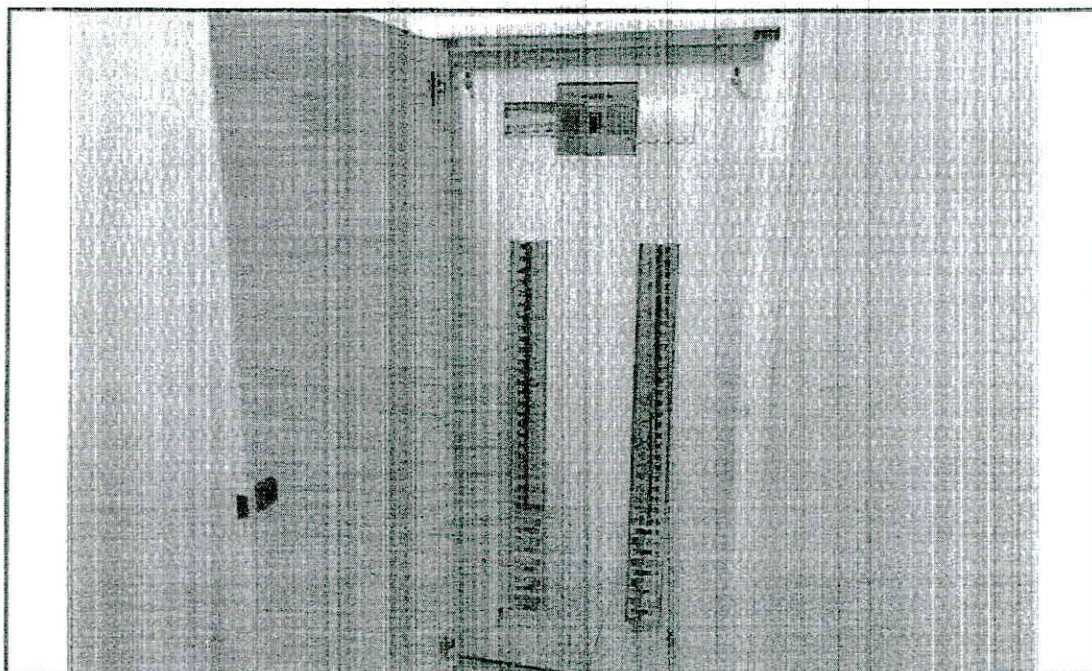


Item executado:

Instalação elétrica- 20/01/2021

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

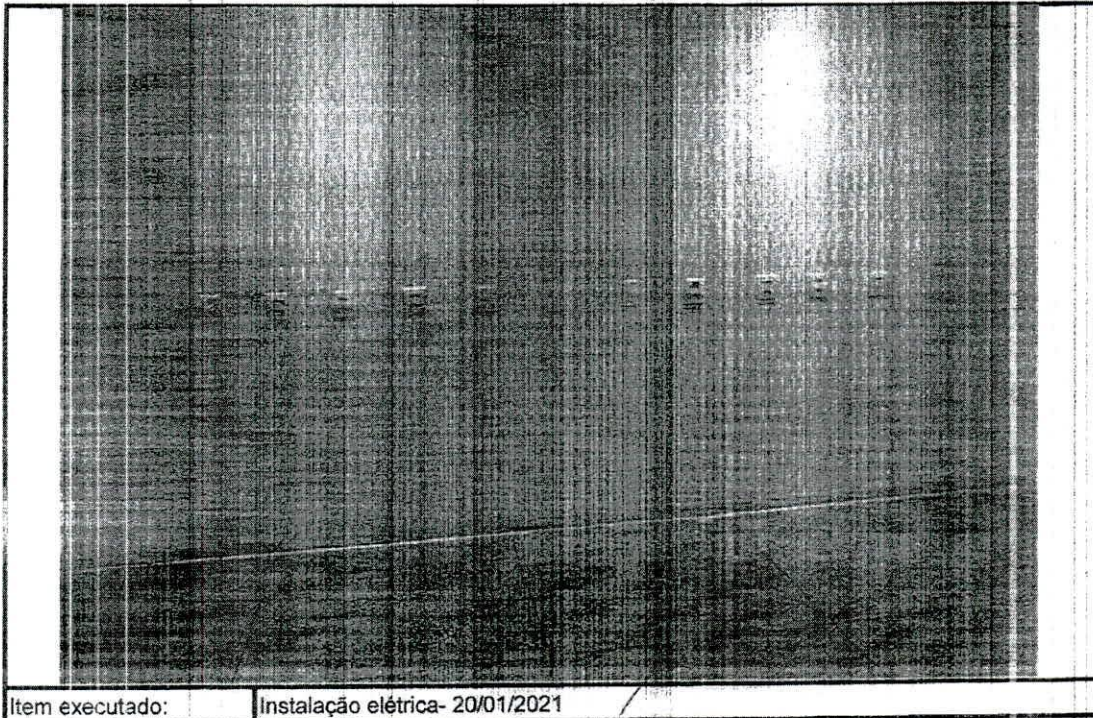

Item executado: Instalação elétrica- 20/01/2021

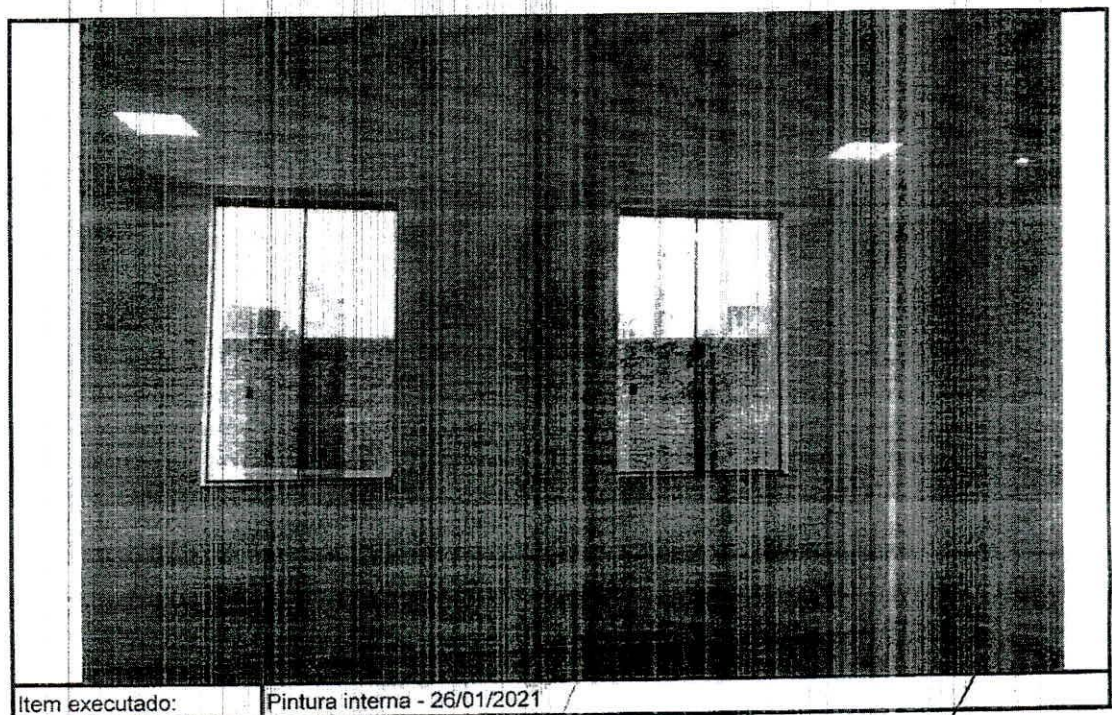

Item executado: Pintura interna - 26/01/2021

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO


Câmara Municipal de Vilhena

Proc n 163121


Fls 42-V

[Handwritten signature]

Proc.: 25242C
Fl.: 138
5

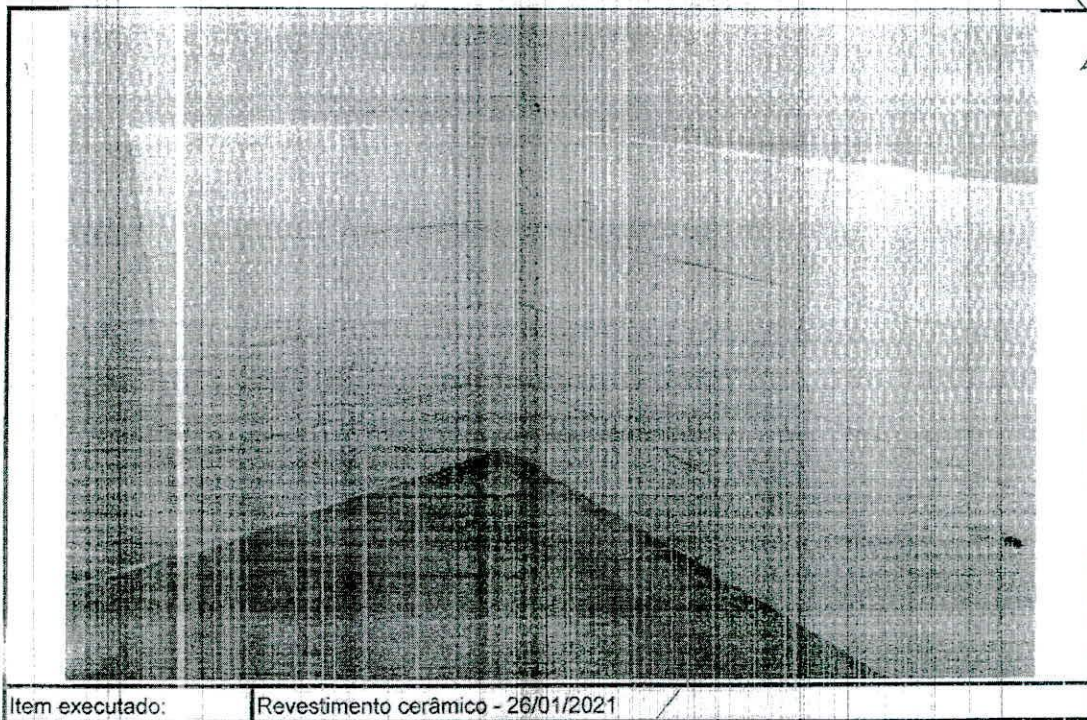

Item executado: Revestimento cerâmico - 26/01/2021

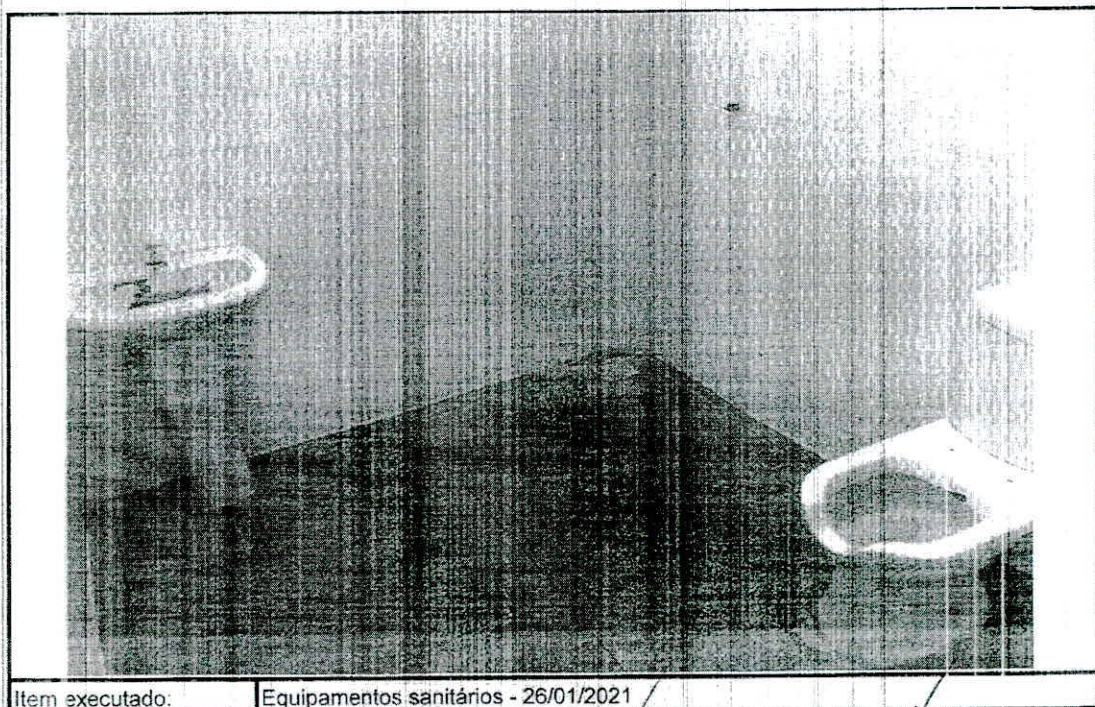

Item executado: Equipamentos sanitários - 26/01/2021

[Handwritten signature]
Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RO

Câmara Municipal de Vilhena


Proc n° 1672

Fls 13


Proc.: 25120

Fl.: 1377

8

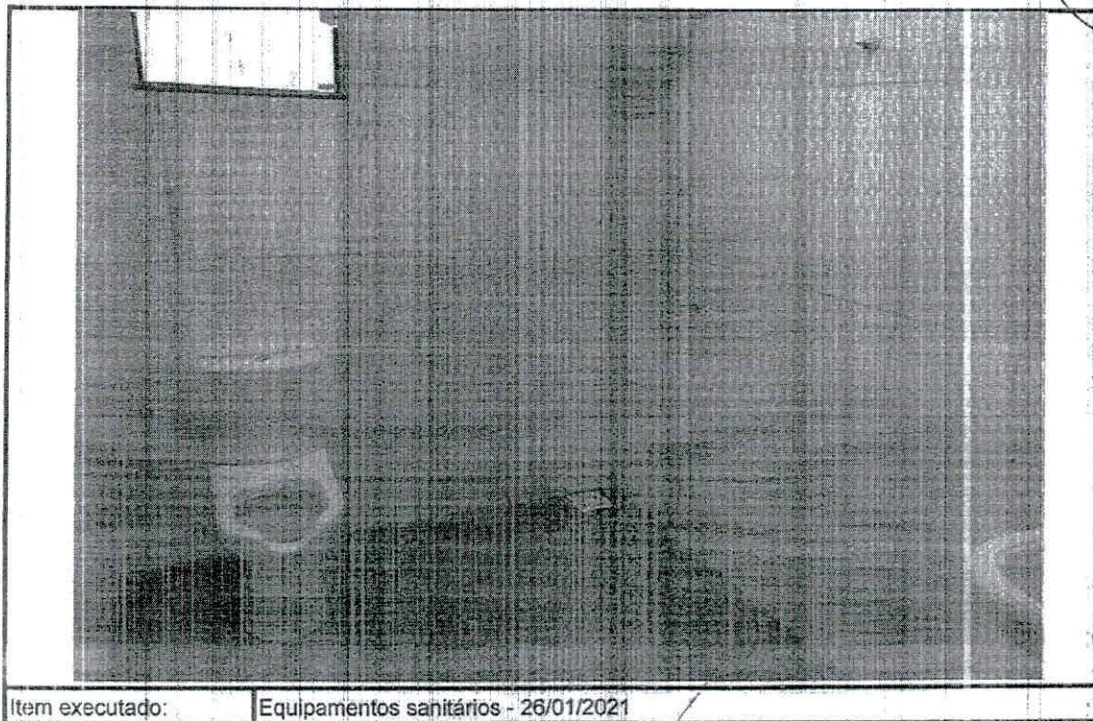

Item executado: Equipamentos sanitários - 26/01/2021

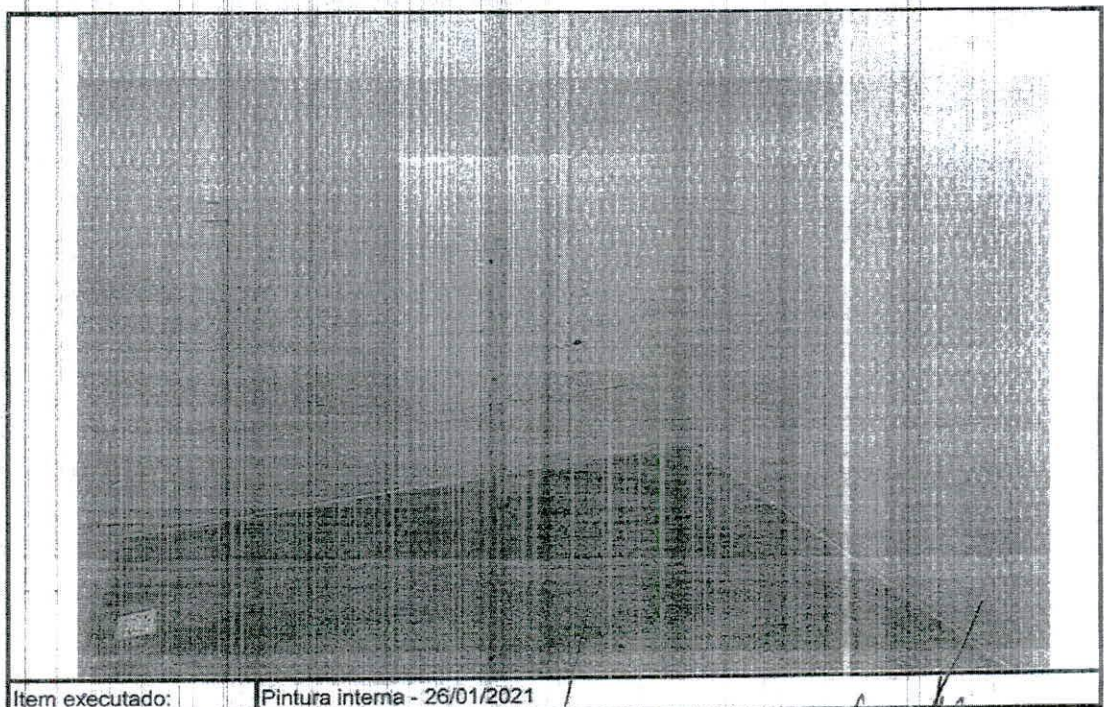

Item executado: Pintura interna - 26/01/2021

Renan Vieira de Andrade
Engenheiro Civil
CREA 6996-D/AL
Visto 9627 RQ



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0001

DATA 14/08/2020 TEMPO: BOM ☒ CHUVA DE À 1 H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Assinatura Ordem Serviço

ASSINATURAS:

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CPLA 001.110.010

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



Câmara Municipal de Vilhena
Proc n° 163/20

Fis 44
69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0002

DATA 15/08/2020 TEMPO: BOM ☐ CHUVA DE À 1 H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Início mobilização

ASSINATURAS:

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CPLA 001.110.010

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0003

DATA 16/08/2020 TEMPO: BOM ☐ CHUVA DE À 1 H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

leposuço final

ASSINATURAS:

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CPLA 001.110.010

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0004

DATA 17/08/2020 TEMPO: BOM ☐ CHUVA DE À 1 H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Mobilização

ASSINATURAS:

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CPLA 001.110.010

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas 36 0005

DATA: 18/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

instalação

ASSINATURAS:

Engenheiro Adilson de Oliveira
TÍTULO Nº 160.014
C.R.C. Nº 160.014

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas 36 0006

DATA: 19/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Início com novo obras

ASSINATURAS:

Engenheiro Adilson de Oliveira
TÍTULO Nº 160.014
C.R.C. Nº 160.014

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas 36 0007

DATA: 20/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

instalação Tapume no contorno da caixa d'água

ASSINATURAS:

Engenheiro Adilson de Oliveira
TÍTULO Nº 160.014
C.R.C. Nº 160.014

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº /
Folhas 36 0008

DATA: 21/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Continuação Tapume e
Contorno da caixa Octogonária

ASSINATURAS:

Engenheiro Adilson de Oliveira
TÍTULO Nº 160.014
C.R.C. Nº 160.014

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0003

DATA: 22/08/2020 TEMPO: BOM X CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Conteúdo de obra bloco ortopedia
Demolição Muro para abertura de portas
de Acesso (30,50 mts) - Serviço
autorizado pelo Fiscal de Obra.

ASSINATURAS:

[Assinatura]
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 00000000000000000000

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0010

DATA: 23/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Repasso Semanal.

ASSINATURAS:

[Assinatura]
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 00000000000000000000

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0011

DATA: 24/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Início demolição Abrigo de Lixo
- Retinada janelas e portas ortopedia

ASSINATURAS:

[Assinatura]
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 00000000000000000000

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0012

DATA: 25/08/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Retinada de portas e janelas ortopedia
- Limpeza de estufas dentro ortopedia

ASSINATURAS:

[Assinatura]
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 00000000000000000000

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - ROObra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01 /
Folhas Nº 0013

DATA: 26/06/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Demolição Alvenaria e Fundações Abaixo de Lixo existente
- Demolição de Revestimento cerâmico ortopedista

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - ROObra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01 /
Folhas Nº 0014

DATA: 27/06/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Armação Formagem Abaixo Lixo
- Demolição Revestimento cerâmico - Retinada de estufa

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - ROObra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01 /
Folhas Nº 0015

DATA: 28/06/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Armação Formagem Abaixo Lixo
- Demolição Rodapé cerâmico ortopedista

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - ROObra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01 /
Folhas Nº 0016

DATA: 28/06/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Armação Formagem Abaixo Lixo
- Demolição Alvenaria ortopedista
- Retinada de estufa

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 01 /
Folhas Nº 0017

DATA 30/06/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reparo Semaual.

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 01 /
Folhas Nº 0018

DATA 30/06/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Demolição de Alvenaria
- Locação Obra Abrigo Lixo
- Amassado das sapatas e bolachas

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: Construção Escola Educação Infantil - Bianca e
Leonardo de Mattos Bezerra
Contrato: 227/2012 - Processo Admin: 612/2012
Local: QD 02, Lote 05-A ST 73 - Vilhena/RO

Livro n° 01 /
Folhas Nº 0019

DATA 01/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Locação do Abrigo de Lixo e início
Escavações manuais.
- Demolição de Alvenaria.

Obs: Solicitação de Engenharia Fiscal p/
Remoção e substituição de Rede
de Abastecimento de Água potável
Tubo 4" 50mm.

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: Construção Escola Educação Infantil - Bianca e
Leonardo de Mattos Bezerra
Contrato: 227/2012 - Processo Admin: 612/2012
Local: QD 02, Lote 05-A ST 73 - Vilhena/RO

Livro n° 01 /
Folhas Nº 0020

DATA 02/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Escavação de Vão Fundação.
- Demolição de Alvenaria
- Retirada de entulho.

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0021

DATA: 03/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Escavação manual de valas.
- Amarração de Funnos Fundação.
- Execução de Alvenaria - Fechamento de Janelas.
Obs: Apresentação do Novo Layout da Área de Memória p/ Caminhão de Lixo.

ASSINATURAS:

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0022

DATA: 04/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Demolição de Piso
- Assentamento de Alvenaria
- Amarração de Funnos - Lixo.

ASSINATURAS:

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0023

DATA: 05/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0024

DATA: 06/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Repose Semanal

ASSINATURAS:

ENGº FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0025

DATA: 01/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Feriado Nacional - Não Trabalhado

ASSINATURAS:

ENG. DA CONSTRUÇÃO
Adamastor Teixeira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 000000000000000000

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0026

DATA: 01/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Assentamento de Alvenaria.
- Demolição de piso e alvenaria rodapé
- Concretagem Sapatas Abrigo de Lixo

ASSINATURAS:

ENG. DA CONSTRUÇÃO
Adamastor Teixeira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 000000000000000000

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0027

DATA: 01/09/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Formas vigas baldrame - Abrigo Lixo.
- Amassado Ferragem
- Demolição alvenaria p/ rodapé
- Assentamento de Alvenaria.

ASSINATURAS:

ENG. DA CONSTRUÇÃO
Adamastor Teixeira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 000000000000000000

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 01 /
Folhas Nº 0028

DATA: 01/09/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem das Formas Vigas Baldrame - Lixo
- Montagem das ferragens V.B - Lixo
- Reboco de Alvenaria - Lixo
- Demolição de laje de PVC - Lixo
- Demolição de piso cerâmico e rodapé - Lixo

ASSINATURAS:

ENG. DA CONSTRUÇÃO
Adamastor Teixeira de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA 000000000000000000

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construivil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - ROObra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01
Folhas 0029

DATA: 11/03/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Construção das Vigas de concreto - Lixo
- Reparo na Alvenaria - Outro
- Trocas de piso cerâmico e pedregulho - Outro
- Trocas Instalações elétricas - Outro
- Trocas Fiação Placa.

ASSINATURAS:

Eng. da Construção
Eduardo de Oliveira
CREA RO 016070

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivil_vha@hotmail.com

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01
Folhas 0030

DATA: 12/03/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Lixo Trabalho

ASSINATURAS:

Eng. da Construção
Eduardo de Oliveira
CREA RO 016070

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construivil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - ROObra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/ROLivro nº 01
Folhas 0031

DATA: 13/03/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Repouso Semanal

ASSINATURAS:

Eng. da Construção
Eduardo de Oliveira
CREA RO 016070

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 021

Folhas Nº 0001

DATA: 14/03/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒ 01	PEDREIRO	☒ 02	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒ 05
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒ 02	☐	☐
ENCARREGADO	☒ 01	ARMADOR	☐	PINTOR	☐	☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Desmontagem Formas baldrame
- Impermeabilização viga baldrame
- Abrigo Lixo - 120 m³
- Demolição Form PVC.
- Demolição Instalação elétrica
- Alvenaria fechamento janelas.

ASSINATURAS

477-t
Heloise Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 216710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 021

Folhas Nº 0002

DATA: 15/03/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒ 1	PEDREIRO	☒ 3	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒ 5
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒ 2	☐	☐
ENCARREGADO	☒ 1	ARMADOR	☐	PINTOR	☐	☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Assentamento Alvenaria Abrigo Lixo.
- Demolição Form de PVC.
- Demolição Inst. Elétrica
- Alvenaria fechamento janela
- Reboco

ASSINATURAS

477-t
Heloise Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 216710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 021

Folhas Nº 0003

DATA: 16/03/2021 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒ 1	PEDREIRO	☒ 3	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒ 5
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒ 2	☐	☐
ENCARREGADO	☒ 1	ARMADOR	☐	PINTOR	☐	☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvenaria Abrigo Lixo.
- Demolição fechamento forma
- Demolição Inst. Elétrica
- Alvenaria e Reboco.

ASSINATURAS

477-t
Heloise Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 216710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 021

Folhas Nº 0004

DATA: 17/03/2021 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒ 1	PEDREIRO	☒ 3	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒ 5
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐	☐	☐
ENCARREGADO	☒ 1	ARMADOR	☐	PINTOR	☐	☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvenaria Abrigo do Lixo
- Alvenaria divisória, antepedia
- Reboco antepedia
- Formagem vigas do Teto Lixo

ASSINATURAS

477-t
Heloise Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 216710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 02
Folhas N° 0005

DATA: 18/03/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Formas Pilares e concretagem - Lixo
- Alvenaria e reboco ortopedica

ASSINATURAS:

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710710

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 02
Folhas N° 0006

DATA: 19/03/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não Trabalhado

ASSINATURAS:

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710710

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 02
Folhas N° 0007

DATA: 20/03/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Desconto Remunerado

ASSINATURAS:

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710710

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 02
Folhas N° 0008

DATA: 21/03/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvenaria Abaixo Lixo
- Formas de pilares - Lixo
- Alvenaria e reboco ortopedica

ASSINATURAS:

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710710

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0009

DATA: 22/03/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO 1 PEDREIRO 3 ENCANADOR 0 SERVENTE 8
MESTRE 0 CARPINTEIRO 0 ELETRICISTA 0
ENCARREGADO 1 ARMADOR 0 PINTOR 0

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Contratação de Jargos - Lixo.
- Alvenaria - Lixo.
- Demolição de piso p/ Rede de esgoto.
- Rasgo em alvenaria p/ Instalação elétrica
- Regularização de piso - Ortopedia.

ASSINATURAS

477-1
Hermes Acme dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0010

DATA: 23/03/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO 1 PEDREIRO 3 ENCANADOR 0 SERVENTE 8
MESTRE 0 CARPINTEIRO 0 ELETRICISTA 0
ENCARREGADO 1 ARMADOR 0 PINTOR 0

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvenaria Respaldo Lixo.
- Demolição de piso p/ esgoto - ordo
- Rasgo em alvenaria p/ elétrica
- Regularização de juntas
- Regularização do cimento piso.

ASSINATURAS

477-1
Hermes Acme dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0011

DATA: 24/03/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO 1 PEDREIRO 3 ENCANADOR 0 SERVENTE 8
MESTRE 0 CARPINTEIRO 0 ELETRICISTA 0
ENCARREGADO 1 ARMADOR 0 PINTOR 0

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Rasgo em Alvenaria
- Demolição de piso concreto
- Instalação esgoto

ASSINATURAS

477-1
Hermes Acme dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0012

DATA: 25/03/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO 1 PEDREIRO 3 ENCANADOR 0 SERVENTE 8
MESTRE 0 CARPINTEIRO 0 ELETRICISTA 0
ENCARREGADO 1 ARMADOR 0 PINTOR 0

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Rasgo de Alvenaria p/ Inst. Elétrica
- Demolição de piso concreto
- Rasgo de Alvenaria
- Instalação Esgoto

ASSINATURAS

477-1
Hermes Acme dos Santos
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0013

DATA: 28/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado.

ASSINATURAS:

477-1
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710/210

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0014

DATA: 27/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Desconto Remunerado.

ASSINATURAS:

477-1
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710/210

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0015

DATA: 28/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 15:00 A 16:00 H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem Formas Vigas - Lixo
- Passagem em alvenaria p/ Inst. elétrica
- Regueado de Janelas

ASSINATURAS:

477-1
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710/210

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0015

DATA: 28/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 15:00 A 16:00 H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem Formas Vigas - Lixo
- Passagem em alvenaria p/ Inst. elétrica
- Regueado de Janelas

ASSINATURAS:

477-1
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 710/210

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0016

DATA 29/09/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 14:30 À 17:00 H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem Formas Vigas do Teto - Lixo
- Rasgo em Alvenaria.
- Regularização do piso

ASSINATURAS

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Câmara Municipal de Vilhena

Proc nº 167/21

Fis

69 3321-4370



construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0017

DATA 30/09/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem Formas e Fôrmas Vigas Teto
- Regularização piso
- Regulamentos portas e janelas
- Rasgo em Alvenaria.

ASSINATURAS

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0018

DATA 01/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem Formas e Fôrmas Vigas Teto
- Regulamentos portas e janelas
- Regularização de piso
- Rasgo em Alvenaria T.E.
- Fechamento de Rasgo e Fixação caixa 2x4"

ASSINATURAS

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0019

DATA 02/10/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Montagem de Laje primariada.
- Regulamentos de portas e janelas
- Rasgo em Alvenaria.
- Fechamento de Rasgo e Fixação caixa 2x4"

ASSINATURAS

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com


Construvil
 Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

 69 3321-4370
 construvil_vha@hotmail.com
 Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
 CEP 76980-756 - VILHENA - RO

 Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
 ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
 Local: Vilhena/RO

 Livro nº 02
 Folhas Nº 0020

DATA: 03/10/2020 TEMPO:

BOM

CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado.

ASSINATURAS:

 Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA PR 716710

ENG. FISCAL

 Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
 FONES: (69) 3321-4370
 E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
 Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

 69 3321-4370
 construvil_vha@hotmail.com
 Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
 CEP 76980-756 - VILHENA - RO

 Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
 ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
 Local: Vilhena/RO

 Livro nº 02
 Folhas Nº 0021

DATA: 04/10/2020 TEMPO:

BOM

CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Descanso Remunerado.

ASSINATURAS:

 Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA PR 716710

ENG. FISCAL

 Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
 FONES: (69) 3321-4370
 E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
 Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

 69 3321-4370
 construvil_vha@hotmail.com
 Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
 CEP 76980-756 - VILHENA - RO

 Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
 ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
 Local: Vilhena/RO

 Livro nº 02
 Folhas Nº 0022

DATA: 05/10/2020 TEMPO:

BOM

CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

 - Montagem de Laje.
 - Requadramento de portas e janelas.
 - Massa em alvenaria.
 - Refinada de Cobertura - Ondulada.

ASSINATURAS:

 Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA PR 716710

ENG. FISCAL

 Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
 FONES: (69) 3321-4370
 E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
 Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

 69 3321-4370
 construvil_vha@hotmail.com
 Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
 CEP 76980-756 - VILHENA - RO

 Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
 ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
 Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
 Local: Vilhena/RO

 Livro nº 02
 Folhas Nº 0023

DATA: 06/10/2020 TEMPO:

BOM

CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVEnte	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

 - Montagem Formas em Laje.
 - Requadramento portas e janelas.
 - Refinada de coberturas.

ASSINATURAS:

 Engenheiro Civil
 Engenheiro Civil
 CREA PR 716710

ENG. FISCAL

 Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
 FONES: (69) 3321-4370
 E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0024

DATA 09/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Remoção de laje.
- Retirada da cobertura
- Aquedramento de portas, janelas
- Laje em alvenaria - deturpada

ASSINATURAS

47-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0025

DATA 09/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 14:00 À 15:30 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Remoção de estrutura de madeira sobrado
- Instalação água e esgoto para
- Laje de alvenaria - instalação deturpada

ASSINATURAS

47-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0026

DATA 09/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 16:00 À 18:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Laje de alvenaria - lisa
- Alvenaria de platibanda - ortopedica

ASSINATURAS

47-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02 /
Folhas Nº 0027

DATA 10/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não trabalhado.

ASSINATURAS

47-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 718710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Câmara Municipal de Vilhena

Proc n°

Fls



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02

Folhas Nº 0028

DATA: 11/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Despesas Remuneração

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02

Folhas Nº 0029

DATA: 11/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Fundo Nacional

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02

Folhas Nº 0030

DATA: 13/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 14:00 À 15:00 H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvarão platibanda
- Chapisco alvenaria

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 02

Folhas Nº 0031

DATA: 14/10/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvenaria e estrutura concreto armado
platibanda ortopedias

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03 /
Folhas Nº 0001

DATA: 15/10/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alvenaria plotibanda - outopeda
- Chapisco de Alvenaria - Abaixo Lado

ASSINATURAS:

Eng.º DA CONTRATAÇÃO
Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
C.R.A. nº 710710

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03 /
Folhas Nº 0002

DATA: 16/10/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Guarnição Cota superior - outopeda
- Chapisco de Laje - Lado

ASSINATURAS:

Eng.º DA CONTRATAÇÃO
Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
C.R.A. nº 710710

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03 /
Folhas Nº 0003

DATA: 17/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

Eng.º DA CONTRATAÇÃO
Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
C.R.A. nº 710710

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03 /
Folhas Nº 0004

DATA: 18/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Descanso Remunerado

ASSINATURAS:

Eng.º DA CONTRATAÇÃO
Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
C.R.A. nº 710710

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc. admin. 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n.º 03
Folhas N.º 0005

DATA: 19/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Chapisco de base - Lixo
- Reboco Alvenaria plastificada - obra

ASSINATURAS:

457-t

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc. admin. 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n.º 03
Folhas N.º 0006

DATA: 20/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Alvenaria - Abriço Lixo
- Regularização de piso
- Reboco e fechamento de paredes } obra

ASSINATURAS:

457-t

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc. admin. 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n.º 03
Folhas N.º 0007

DATA: 21/10/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Alvenaria - Abriço Lixo
- Início estruturas - Estrutura metálica - obra
- Piso granilite - obra

ASSINATURAS:

457-t

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc. admin. 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n.º 03
Folhas N.º 0008

DATA: 21/10/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Alvenaria - Lixo
- Estrutura metálica
- Piso granilite
- Alvenaria plastificada } obra

ASSINATURAS:

457-t

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena RO

Livro n° 03
Folhas N° 0009

DATA 23/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ *Servente (2)*

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Alvenaria - Lixo
- Estrutura metálica
- Piso granilite
- Reboco Alvenaria platibanda } *Orto*

ASSINATURAS:

Eng. Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 78 - 216717-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena RO

Livro n° 03
Folhas N° 0010

DATA 24/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

Eng. Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 78 - 216717-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena RO

Livro n° 03
Folhas N° 0011

DATA 25/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Despesas Remuneradas

ASSINATURAS:

Eng. Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 78 - 216717-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena RO

Livro n° 03
Folhas N° 0012

DATA 26/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ *Servente (2)*

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Alvenaria - Lixo
- Estrutura metálica
- Piso granilite } *Orto*

ASSINATURAS:

Eng. Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 78 - 216717-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas N° 0013

DATA: 27/10/2022 TEMPO: 8:00 CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒ *Edelberto*

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reforço de Alvenaria - *lizo*
- Estrutura metálica } *orto*
- Piso granilite

ASSINATURAS:

457
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA Nº 216/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas N° 0014

DATA: 28/10/2022 TEMPO: 8:00 CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒ *Edelberto*

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reforço de Alvenaria - *lizo*
- Estrutura metálica } *orto*
- Piso granilite
- Regueiramentos

ASSINATURAS:

457
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA Nº 216/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas N° 0015

DATA: 29/10/2022 TEMPO: 8:00 CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒ *Edelberto*

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reforço de Alvenaria - *lizo*
- Estrutura metálica } *orto*
- Piso granilite

ASSINATURAS:

457
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA Nº 216/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas N° 0016

DATA: 30/10/2022 TEMPO: 8:00 CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒ *Edelberto*

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reforço de Alvenaria - *lizo*
- Estrutura metálica } *orto*
- piso granilite

ASSINATURAS:

457
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA Nº 216/710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03 /
Folhas N° 0017

DATA 31/10/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não Trabalhado

ASSINATURAS

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 216/210

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03 /
Folhas N° 0018

DATA 04/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Descanso Remunerado

ASSINATURAS

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 216/210

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03 /
Folhas N° 0019

DATA 02/11/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Retorno da Loja - Lixo
- Cobertura de Telha Termica -
- Piso granilite
- Registros muros } outro

ASSINATURAS

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 216/210

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03 /
Folhas N° 0020

DATA 03/11/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Retorno da Loja - Lixo
- Cobertura de Telha Termica -
- Piso granilite
- Registros muros } outro

ASSINATURAS

477-t
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 216/210

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Câmara Municipal de Vilhena

Proc n°

Fis



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03

Folhas N° 0024

DATA: 04/11/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ *Soldador* ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Laje - Lixar
- Cobertura Telha Termica } out
- Piso granilite
- Pequenos muros

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Háryson Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.F. 111.710/111

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03

Folhas N° 0022

DATA: 05/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 7:00 A 16:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reboco de Laje - Lixar
- Piso granilite
- Pequenos muros } out

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Háryson Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.F. 111.710/111

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03

Folhas N° 0023

DATA: 06/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Regulação de portas } Lixar
- Estrutura cobertura - madeira } out
- Piso granilite
- Regulações de portas

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Háryson Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.F. 111.710/111

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03

Folhas N° 0024

DATA: 07/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não trabalhado

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Háryson Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.F. 111.710/111

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO


Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL - ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas Nº 0025

DATA: 08/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:
Domingo Descanso Remunerado

ASSINATURAS:  ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL - ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas Nº 0026

DATA: 09/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 15:30 À 16:30 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:
- estrutura de madeira estruturas } Lixo
- Reaparelhamento de portas } Lixo
- piso granilite - novo

ASSINATURAS:  ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO


Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL - ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas Nº 0027

DATA: 10/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 16:00 À 16:30 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:
- Cobertas } Lixo
- Reaparelhamento de portas } Lixo
- piso granilite } Lixo
- Instalação elétrica } outro

ASSINATURAS:  ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Construvil
Construtora e Instaladora Vilhena Ltda.

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO


Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL - ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 03
Folhas Nº 0028

DATA: 11/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 16:30 À 16:45 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:
- Cobertas Telas Fibrocimento } Lixo
- Reaparelhamento de portas } Lixo
- piso granilite } Lixo
- Instalação elétrica } outro

ASSINATURAS:  ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03
Folhas Nº 0029

DATA: 12/11/2020 TEMPO: 1 HOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Instalação tubos } OXO
- Revestimento pilares } OXO
- Piso granilite } OXO
- Instalação elétrica } OXO

ASSINATURAS:

477-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 198.710/RO

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03
Folhas Nº 0030

DATA: 13/11/2020 TEMPO: BDM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimentos } 4x4
- Contra piso }
- Instalação elétrica } OXO
- Piso granilite } OXO
- Instalação hidráulica } OXO

ASSINATURAS:

477-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 198.710/RO

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 03
Folhas Nº 0031

DATA: 14/11/2020 TEMPO: BDM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não trabalhado.

ASSINATURAS:

477-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 198.710/RO

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0031

DATA: 15/12/2020 TEMPO: BDM CHUVA DE 2:00 A 11:00 H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Piso granilite - 6x6
- Inst. elétrica } OXO
- Revestimento cerâmico } OXO
- Aplicação seladora } OXO

ASSINATURAS:

477-t
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 198.710/RO

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76880-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0030

DATA: 14/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 200 A 200 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒ *Cespeiro* ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Piso granilite - Lixo
- Inst. Elétrica
- Forro de gesso } Oco
- Revestimentos Cerâmicos

ASSINATURAS:

477-t
Eng.º da Construção
Hervé Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 12.121-1/RO

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76880-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0029

DATA: 13/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Descontos Remunerado

ASSINATURAS:

477-t
Eng.º da Construção
Hervé Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 12.121-1/RO

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76880-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0028

DATA: 12/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

477-t
Eng.º da Construção
Hervé Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 12.121-1/RO

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76880-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0027

DATA: 11/12/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒ *Cespeiro* ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Piso granilite
- Alvenaria subestacas } Lixo
- Inst. Elétrica
- Forro de gesso } Oco
- Aplicação de selador

ASSINATURAS:

477-t
Eng.º da Construção
Hervé Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 12.121-1/RO

ENG.º FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 212/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04

Folhas Nº 0026

DATA: 10/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 1500 à 1800 H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒	Gessino	☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Enmassamento parede } Lixo
- Piso granilite }
- Alvenaria rebocada }
- Inst. Elétrica }
- Forro de gesso } Oito

ASSINATURAS:

PRO. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 716710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04

Folhas Nº 0025

DATA: 09/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒	Gessino	☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Enmassamento parede }
- piso granilite }
- Colocamento externo a muçeta atombado }
- Inst. Elétrica }
- Forro de gesso } Oito

ASSINATURAS:

PRO. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 716710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 212/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04

Folhas Nº 0024

DATA: 08/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 1100 à 15:30 H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒	Gessino	☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Trazido pintura - enmassamento - Lixo
- Colocamento externo - Lixo
- Instalações elétrica }
- Forro de gesso } Oito
- Trazido pintura }

ASSINATURAS:

PRO. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 716710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04

Folhas Nº 0023

DATA: 07/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 16:00 à 18:00 H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒	Gessino	☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Colocamento externo - Lixo
- Instalações elétrica }
- Forro de gesso } Oito
- Trazido pintura }

ASSINATURAS:

PRO. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA PR 716710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas N° 0022

DATA: 06/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Desuso Remanescente

ASSINATURAS

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 1717470

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas N° 0021

DATA: 05/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalho

ASSINATURAS

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 1717470

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas N° 0020

DATA: 07/12/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alçamento externo }uro
- Fossa }uro
- Instalação elétrica }uro
- Forno de gesso }uro

ASSINATURAS

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 1717470

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas N° 0019

DATA: 07/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 7:00 À 9:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Alçamento externo }uro
- Fossa }uro
- Inst. Elétrica }uro
- Forno de gesso }uro
- Pintura granada }uro

ASSINATURAS

Henrique Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-RO 1717470

ENG° FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas 0018

DATA: 02/12/2020 TEMPO: 5 ROM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ Gesso ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Calçamento externo - Lixo
- Rodape Marmore
- Inst. Elétrica
- Forno de gesso } Oito

ASSINATURAS:

ING. DA CONTRATA
Humberto Anderson Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 171.167/11-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas 0017

DATA: 01/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ Gesso ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Rejunte cerâmica - Lixo
- Rodape marmore
- Pedestal granito
- Instalação elétrica
- Forno de gesso } Oito

ASSINATURAS:

ING. DA CONTRATA
Humberto Anderson Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 171.167/11-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas 0016

DATA: 30/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ Gesso ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico, rejuntamento - Lixo
- Rodape marmore
- Pedestal granito
- Instalação elétrica
- Forno de gesso } Oito

ASSINATURAS:

ING. DA CONTRATA
Humberto Anderson Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 171.167/11-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04
Folhas 0015

DATA: 29/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTeiro ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Descanso Remunerado.

ASSINATURAS:

ING. DA CONTRATA
Humberto Anderson Moraes
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 171.167/11-0

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 09
Folhas Nº 0014

DATA: 26/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Nas Trabalho

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Adamastor Teixeira de Oliveira

ENGENHEIRO CIVIL

CRLA Nº 710.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370

E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 09
Folhas Nº 0013

DATA: 27/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 200 A 900 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELI TRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ *Cassio* ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico - 4x2
- Pedraço Marmore
- Assentamento de pedralha
- Instalação elétrica
- Forno de gesso

Outro

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Adamastor Teixeira de Oliveira

ENGENHEIRO CIVIL

CRLA Nº 710.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370

E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 09
Folhas Nº 0012

DATA: 26/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ *Cassio* ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico - 4x2
- Pedraço Marmore
- Piso granilite
- Instalação elétrica
- Forno de gesso

Outro

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Adamastor Teixeira de Oliveira

ENGENHEIRO CIVIL

CRLA Nº 710.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370

E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 09
Folhas Nº 0011

DATA: 25/11/2020 TEMPO: ☒ BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTIRO ☐ ELI TRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐ *Cassio* ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico - 4x2
- Pedraço Marmore
- Instalação elétrica
- Forno de gesso

Outro

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Adamastor Teixeira de Oliveira

ENGENHEIRO CIVIL

CRLA Nº 710.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370

E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0010

DATA: 24/11/2020 TEMPO: ROM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☒	SERVENTE	☒
MESTRE	☒	CARPINTEIRO	☒	ELETRICISTA	☒		☒
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☒	PINTOR	☒		☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico - Lixo
- Piso granilite
- Rodapé Marmon
- Inst. Elétrica - Microsistema
- Furo da Bacia de Jato

ASSINATURAS:

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0009

DATA: 23/11/2020 TEMPO: 8BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☒	SERVENTE	☒
MESTRE	☒	CARPINTEIRO	☒	ELETRICISTA	☒		☒
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☒	PINTOR	☒		☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico - Lixo
- Piso granilite
- Rodapé cerâmico
- Instalação Elétrica

ASSINATURAS:

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 52/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0005

DATA: 22/11/2020 TEMPO: ROM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Descanso Remunerado

ASSINATURAS:

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04
Folhas Nº 0007

DATA: 21/11/2020 TEMPO: ROM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

ENG - FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04

Folhas 12 0006

DATA: 23/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 8:00 À 12:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☒ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento cerâmico - Lixo
- Rodapé Mármore
- Instalação elétrica e Hidráulica } Oito

ASSINATURAS

457-t
FABRICA CONTRATADA
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA PR. 116/10

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04

Folhas 12 0005

DATA: 19/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☒ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Início Revestimento cerâmico - Lixo
- Piso granilite
- Rodapé Mármore
- Instalação elétrica
- Instalação Hidrossanitária } Oito

ASSINATURAS

457-t
FABRICA CONTRATADA
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA PR. 116/10

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04

Folhas 12 0004

DATA: 16/11/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☒ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimentos - Lixo
- Piso granilite
- Rodapé Mármore
- Instalação elétrica
- Instalação Hidrossanitária } Oito

ASSINATURAS

457-t
FABRICA CONTRATADA
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA PR. 116/10

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 04

Folhas 12 0003

DATA: 17/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☒ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimentos - Lixo
- Piso granilite
- Rodapé Mármore
- Instalação elétrica
- Instalação Hidrossanitária } Oito

ASSINATURAS

457-t
FABRICA CONTRATADA
ENGENHEIRO CIVIL
CRLA PR. 116/10

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 21/2/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04

Folhas 002

DATA: 16/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 200 A 900 H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☒	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- obra piso de concreto / LxO
- Regulação de entos
- piso granilite
- Reclamação em presença / Oito
- Instalação Hidráulica
- Instalação Elétrica

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTEÚDA
Henrique Anderson Martins
CRA 010 176.710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (+55) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 25/2/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 04

Folhas 001

DATA: 15/11/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Descanso Remunerado

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTEÚDA
Henrique Anderson Martins
CRA 010 176.710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (+55) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construivl_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05

Folhas 2 0031

DATA 15/01/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna e externa
- Montagem portas de Alumínio
- Montagem bancadas
- Montagem luminárias

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivl_vha@hotmail.com



Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05

Folhas 2 0030

DATA 19/01/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna e Externa
- Montagem portas de Alumínio
- Montagem de bancadas
- Montagem de Luminárias

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivl_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construivl_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05

Folhas 2 0029

DATA 13/01/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☒ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna e externa
- Montagem portas de Vidro
- Montagem de bancadas e luminárias
- Inst. Elétrica

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivl_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construivl_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05

Folhas 2 0028

DATA 12/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 7:00 A 10:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPinteIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna
- Montagem de Portas de Vidro
- Montagem de bancadas
- Inst. Elétrica

ASSINATURAS:

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construivl_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0027

DATA: 11/01/2021 TEMPO: ☒ BOM CHUVA DE ____ À ____ H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura
- Montagem esquadrias de vidro
- Montagem de bancadas
- Montagem de equipamentos sanitários

ASSINATURAS:

47-1
Eng.º DA CONTRATAÇÃO

ENG.º FISCAL

Eng.º Anderson Martins
Engenheiro Civil
Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0026

DATA: 10/01/2021 TEMPO: ☐ BOM CHUVA DE ____ À ____ H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Desconto Remunerado

ASSINATURAS:

47-1
Eng.º DA CONTRATAÇÃO

ENG.º FISCAL

Eng.º Anderson Martins
Engenheiro Civil
Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0025

DATA: 09/01/2021 TEMPO: ☐ BOM CHUVA DE ____ À ____ H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

47-1
Eng.º DA CONTRATAÇÃO

ENG.º FISCAL

Eng.º Anderson Martins
Engenheiro Civil
Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0024

DATA: 08/01/2021 TEMPO: ☐ BOM CHUVA DE 12:00 À 13:20 H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Reajustamento de Reajustamento
- Instalação elétrica
- Pintura
- Limpeza

ASSINATURAS:

47-1
Eng.º DA CONTRATAÇÃO

ENG.º FISCAL

Eng.º Anderson Martins
Engenheiro Civil
Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vil@hotmai.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas Nº 0023

DATA 02/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 7:00 À 10:30 H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Inst. Elétrica
- Pinturas
- Reparo em calçadas externas

ASSINATURAS

[Assinatura]
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 116.712

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vil@hotmai.com



69 3321-4370
construvil_vil@hotmai.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas Nº 0022

DATA 02/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Inst. Elétrica
- Pinturas
- Reparo em calçadas externas

ASSINATURAS

[Assinatura]
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 116.712

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vil@hotmai.com



69 3321-4370
construvil_vil@hotmai.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas Nº 0024

DATA 05/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Instalação Elétrica
- Revestimento cerâmico
- Pinturas de Forno } Oito

ASSINATURAS

[Assinatura]
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 116.712

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vil@hotmai.com



69 3321-4370
construvil_vil@hotmai.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas Nº 0020

DATA 04/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 7:00 À 12:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Inst. Elétrica
- Revestimento cerâmico
- Pinturas de Forno } Oito

ASSINATURAS

[Assinatura]
ENGENHEIRO CIVIL
CRA 116.712

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vil@hotmai.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0019

DATA: 03/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Desconto Remuneração

ASSINATURAS:

477-t
Hortênsio Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 14.710 - 114.710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0019

DATA: 02/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Não Trabalhados

ASSINATURAS:

477-t
Hortênsio Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 14.710 - 114.710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0019

DATA: 01/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Feriado Nacional

ASSINATURAS:

477-t
Hortênsio Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 14.710 - 114.710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 0019

DATA: 31/10/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Limpeza Abrigo de Lixo
- Empacotamento e Pintura - Outeiro

ASSINATURAS:

477-t
Hortênsio Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 14.710 - 114.710

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Fls 64

69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena RO

Livro nº 051

Folhas 2 0015

DATA: 20/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 17:00 A 18:00 H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Limpeza Abrigo de lixo - Retirada de
catulhos.
- Instalação elétrica
- Revestimento cerâmico
- Pintura de paredes

ASSINATURAS

477-t

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 051

Folhas 2 0014

DATA: 29/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Arremates Pintura - Lixo
- Conclusão Montagem Armadura de Alumínio
- Inst. Elétrica
- Revestimento Cerâmico
- Emassamento e Lixo

ASSINATURAS

477-t

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena RO

Livro nº 051

Folhas 2 0019

DATA: 28/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 7:00 A 18:00 H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura
- Montagem de portas de Alumínio
- Revestimento Cerâmico
- Inst. Elétrica

ASSINATURAS

477-t

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370

construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 051

Folhas 2 0012

DATA: 27/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Dobra Remunerada

ASSINATURAS

477-t

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 36 0014

DATA: 26/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVEnte ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

Ocorrências relacionadas com a execução do contrato:

Não Trabalhado

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
CPF: 014.110.124-05
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 36 0014

DATA: 25/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVEnte ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

Ocorrências relacionadas com a execução do contrato:

Feriado Nacional

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
CPF: 014.110.124-05
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 36 0049

DATA: 24/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVEnte ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

Ocorrências relacionadas com a execução do contrato:

- Pintura - Lixo
- Revestimento Cerâmico - Oito
- Inst. Elétrica

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
CPF: 014.110.124-05
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05
Folhas 36 0049

DATA: 23/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVEnte ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

Ocorrências relacionadas com a execução do contrato:

- Enxossamento e pintura - Lixo
- Revestimento Cerâmico - Oito
- Inst. Elétrica

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Henrique Anderson Martins
CPF: 014.110.124-05
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas 32 0005

DATA: 22/12/2020 TEMPO: 8 BOM CHUVA DE: A H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Pintura e conserto de extensões - Lixo
- Envolvimento de paredes > Lixo
- Revestimento cerâmico > Lixo

ASSINATURAS

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 116.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas 32 0006

DATA: 21/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE: 7:00 A 11:00 H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Envolvimento > Lixo
- Inst. Elétrica > Lixo
- Revestimento cerâmico > Lixo
- Envolvimento > Lixo

ASSINATURAS

ENG. FISCAL

Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 116.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas 32 0005

DATA: 20/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE: A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Desenho Removido

ASSINATURAS

ENG. DA CONTRATADA

ENG. FISCAL

Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 116.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 05 /
Folhas 32 0006

DATA: 19/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE: A H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS

ENG. FISCAL

Henrique Anderson Martins
Engenheiro Civil
CREA 116.710

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05
Folhas N° 0003

DATA: 18/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDEIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Emassamento e fixamento - Lixo
- Inst. Elétrica - Lixo
- Revestimentos cerâmicos } Oito
- Emassamento parede } Oito

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
CREA n° 116771-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05
Folhas N° 0002

DATA: 18/12/2020 TEMPO: X BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDEIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Emassamento e fixamento - Lixo
- Revestimento externo - Lixo
- Inst. Elétrica
- Revestimentos cerâmicos } Oito
- Emassamento } Oito

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
CREA n° 116771-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obras: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 05
Folhas N° 0004

DATA: 16/12/2020 TEMPO: BOM CHUVA DE 12:00 A 14:30 H.

ENGENHEIRO ☒	PEDEIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☒	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☒	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Revestimento externo - Lixo
- Pintura - Lixo
- Inst. Elétrica
- Revestimentos cerâmicos } Oito
- Emassamento } Oito

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
CREA n° 116771-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06
Folhas N° 0001

DATA: 16/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Instalado

ASSINATURAS:

ENGENHEIRO CIVIL
Henrique Anderson Martins

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06
Folhas N° 0002

DATA: 17/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐ PEDREIRO ☐ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☐
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☐
ENCARREGADO ☐ ARMADOR ☐ PINTOR ☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Desconto Remunerado

ASSINATURAS:

ENGENHEIRO CIVIL
Henrique Anderson Martins

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06
Folhas N° 0003

DATA: 18/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☒ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna
- Montagem de Aparelhos Sanitários

ASSINATURAS:

ENGENHEIRO CIVIL
Henrique Anderson Martins

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06
Folhas N° 0004

DATA: 19/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 8:00 A 10:00 H.

ENGENHEIRO ☒ PEDREIRO ☒ ENCANADOR ☐ SERVENTE ☒
MESTRE ☐ CARPINTEIRO ☐ ELETRICISTA ☒
ENCARREGADO ☒ ARMADOR ☐ PINTOR ☒

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna
- Montagem de Aparelhos Sanitários
- Inst. Elétricas

ASSINATURAS:

ENGENHEIRO CIVIL
Henrique Anderson Martins

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas 36 0005

DATA 20/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 12:00 À 18:00H

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Instalação elétrica
- Pintura interna
- Montagem de aparelhos sanitários

ASSINATURAS:

47-1
Eng. Antônio Quintino Gomes
CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA LTDA
CNPJ nº 16.174.111/0001-00

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

OBR: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
LOC: ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
CON: Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas 36 0005

DATA 21/01/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE À H

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura externa
- Montagem de aparelhos sanitários
- Limpeza
- Instalação elétrica

ASSINATURAS:

47-1
Eng. Antônio Quintino Gomes
CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA LTDA
CNPJ nº 16.174.111/0001-00

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas 36 0007

DATA 22/01/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE À H

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☒		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura interna e externa
- Montagem de aparelhos sanitários
- Instalação elétrica
- Limpeza

ASSINATURAS:

47-1
Eng. Antônio Quintino Gomes
CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA LTDA
CNPJ nº 16.174.111/0001-00

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obr: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas 36 0005

DATA 23/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE À H

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

47-1
Eng. Antônio Quintino Gomes
CONSTRUTORA E INSTALADORA VILHENA LTDA
CNPJ nº 16.174.111/0001-00

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

OB LO CO Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas Nº 0009

DATA: 23/4/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☐	PEDREIRO	☐	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☐
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☐	ARMADOR	☐	PINTOR	☐		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Doucos Remunerado.

ASSINATURAS

477-t
HOMERICO ANDERSON MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 116711-2

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas Nº 0010

DATA: 25/6/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna.
- Montagem de Apêndices Sanitários
- Limpeza do Contorno de Obra.

ASSINATURAS

477-t
HOMERICO ANDERSON MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 116711-2

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

OB LO CO Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas Nº 0011

DATA: 26/04/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 15:00h À 16:00h.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura Interna
- Montagem de Apêndices Sanitários
- Limpeza do Contorno de Obra.

ASSINATURAS

477-t
HOMERICO ANDERSON MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 116711-2

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc admin: 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro nº 06 /
Folhas Nº 0012

DATA: 27/04/2021 TEMPO: X BOM CHUVA DE À H.

ENGENHEIRO	☒	PEDREIRO	☒	ENCANADOR	☐	SERVENTE	☒
MESTRE	☐	CARPINTEIRO	☐	ELETRICISTA	☐		☐
ENCARREGADO	☒	ARMADOR	☐	PINTOR	☒		☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Pintura externa
- Limpeza Interna
- Retirada de entulhos.

ASSINATURAS

477-t
HOMERICO ANDERSON MARTINS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 116711-2

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, nº 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc adm: n° 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06 /
Folhas 32 0013

DATA 28/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE 14:00 A 18:00 H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Limpeza Interna
- Limpeza do Cantinho de Obras.

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 218.210-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

O Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
L ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
C Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc adm: n° 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06 /
Folhas 32 0014

DATA 29/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☒	PEDREIRO ☒	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☒
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☒	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Limpeza Interna
- Limpeza do Cantinho de Obras.

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 218.210-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc adm: n° 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06 /
Folhas 32 0015

DATA 30/01/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

- Não Trabalhado

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 218.210-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com



69 3321-4370
construvil_vha@hotmail.com
Av. Antônio Quintino Gomes, 3905 - Jardim América
CEP 76980-756 - VILHENA - RO

Obra: REFORMA DO HOSPITAL REGIONAL -
ADAMASTOR TEIXEIRA DE OLIVEIRA
Contrato: 028/2020 - SEMUS - Proc adm: n° 252/2020
Local: Vilhena/RO

Livro n° 06 /
Folhas 32 0017

DATA 01/02/2021 TEMPO: BOM CHUVA DE A H.

ENGENHEIRO ☐	PEDREIRO ☐	ENCANADOR ☐	SERVENTE ☐
MESTRE ☐	CARPINTEIRO ☐	ELETRICISTA ☐	☐
ENCARREGADO ☐	ARMADOR ☐	PINTOR ☐	☐

OCORRÊNCIAS RELACIONADAS COM A EXECUÇÃO DO CONTRATO:

Assinatura do Termo de Paralisação
de obra

ASSINATURAS:

ENG. DA CONTRATADA
Hermes Anderson Martins
ENGENHEIRO CIVIL
C.R.C. 218.210-1

ENG. FISCAL

Av. Antônio Quintino Gomes, n° 3905, Jd. América - Vilhena/RO
FONES: (69) 3321-4370
E-MAIL: construvil_vha@hotmail.com
